


รายงานสถานการณ์น้ำ

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566



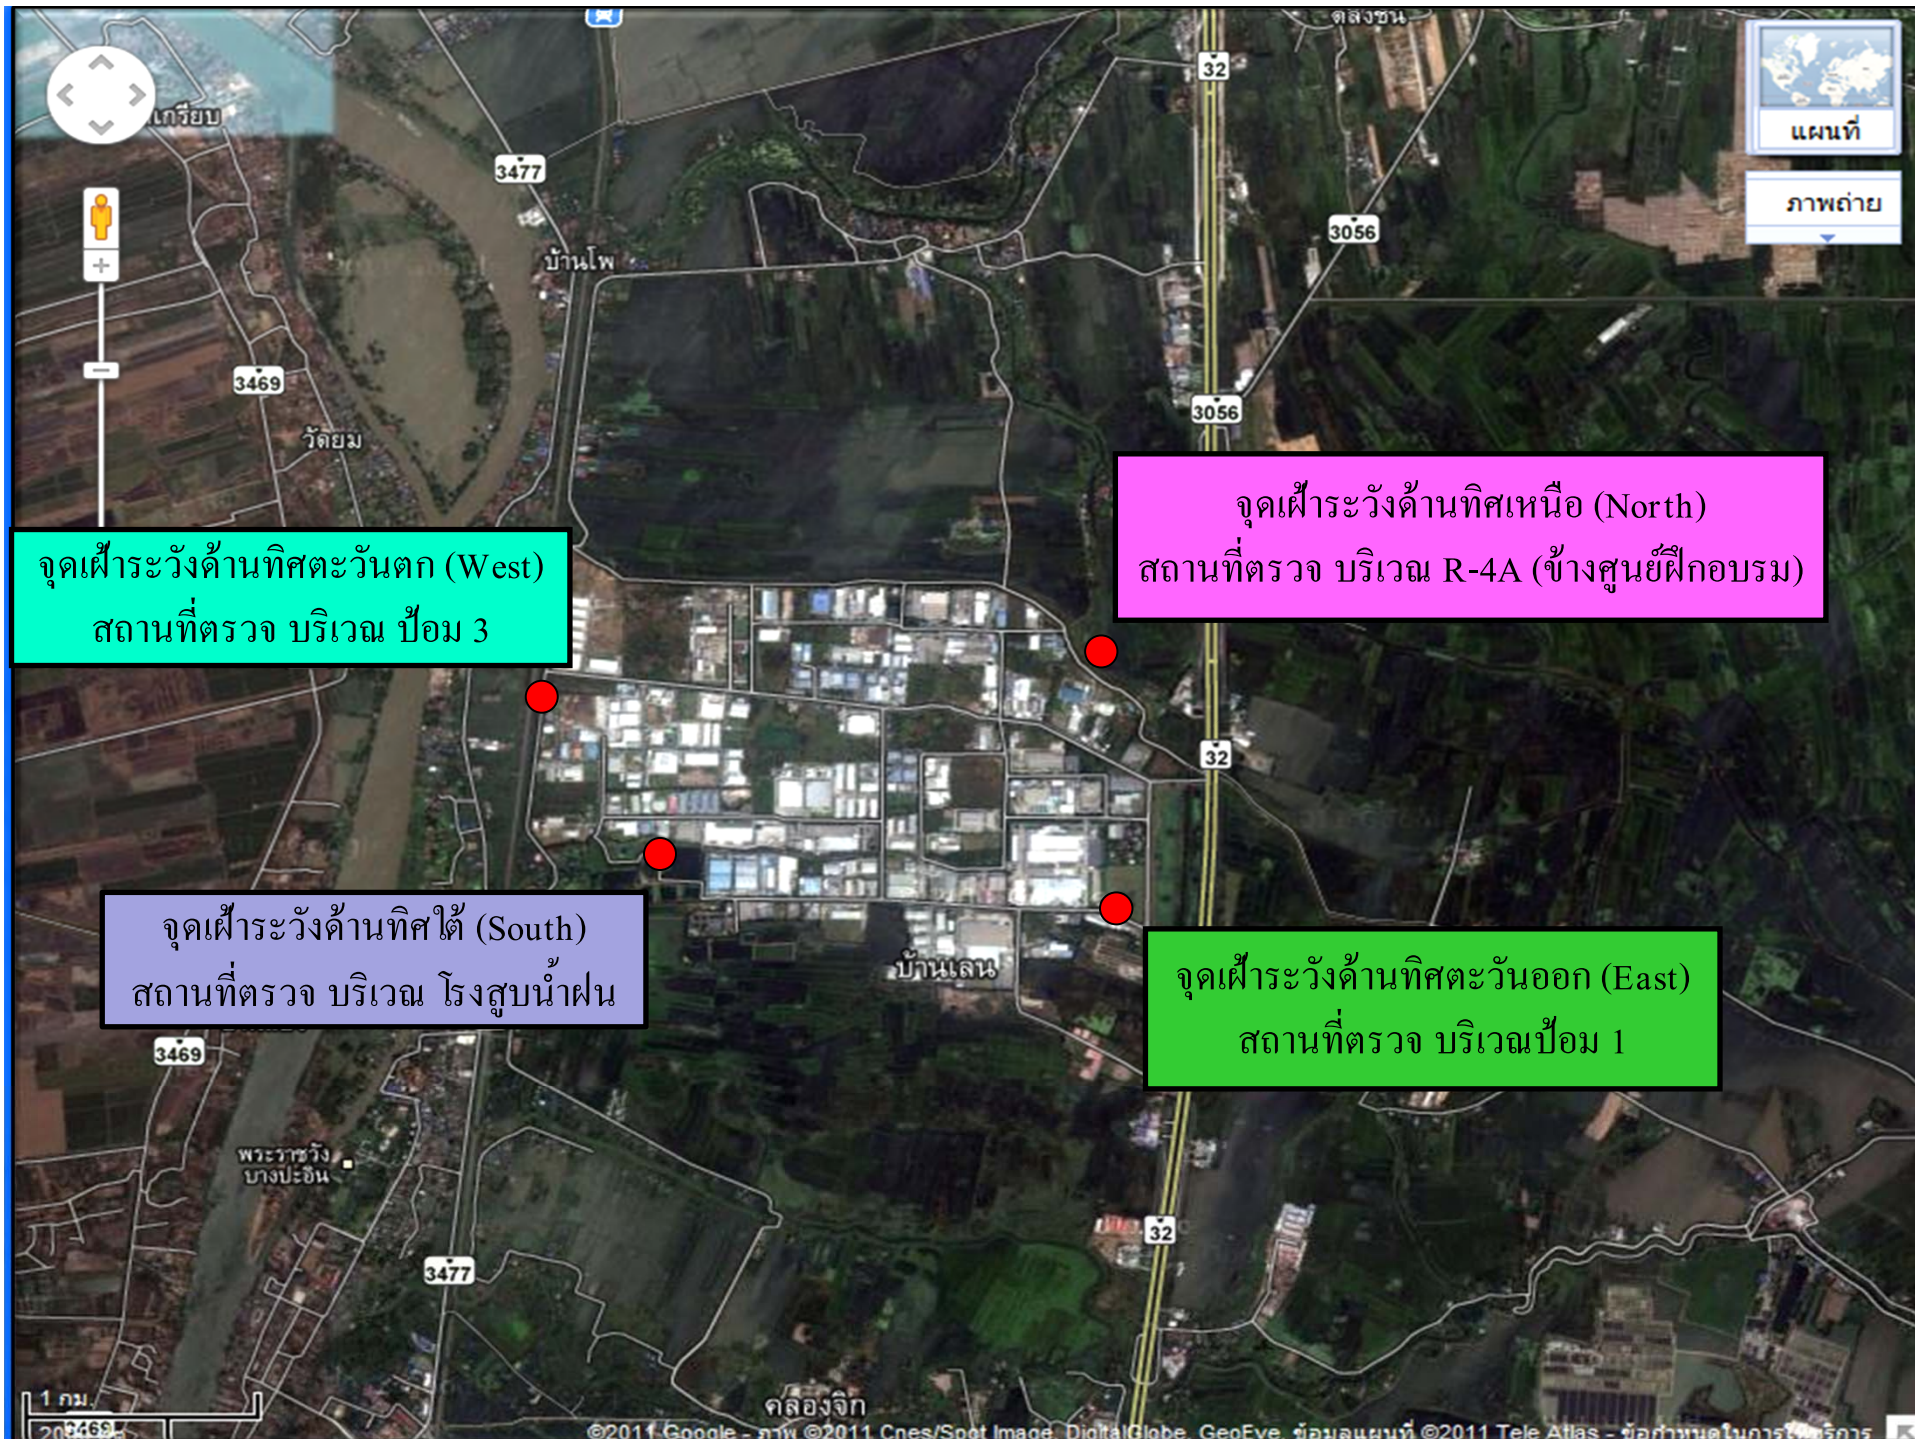

จุดเฝ้าระวังด้านทิศตะวันตก (West)
สถานที่ตรวจ บริเวณ ป้อม 3

จุดเฝ้าระวังด้านทิศเหนือ (North)
สถานที่ตรวจ บริเวณ R-4A (ข้างศูนย์ฝึกอบรบ)

จุดเฝ้าระวังด้านทิศใต้ (South)
สถานที่ตรวจ บริเวณ โรงสูบน้ำฝน

จุดเฝ้าระวังด้านทิศตะวันออก (East)
สถานที่ตรวจ บริเวณ ป้อม 1

เกณฑ์กำหนดการเตือนภัย (อุทกภัย)

สัญลักษณ์เตือนภัย	เกณฑ์/ระดับน้ำนอกคัน	จุดเฝ้าระวัง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
(สีเขียว)	1 (ปกติ) น้อยกว่า 3.500 MSL.	1. ทิศเหนือ จุดวัดระดับน้ำด้านหลังศูนย์เทคโนโลยี 2. ทิศใต้ จุดวัดระดับน้ำด้านหลังสถานีสูบน้ำฝนนิคมฯ 3. ทิศตะวันออก จุดวัดระดับน้ำทางเข้าออกนิคมฯ ประตู 1 4. ทิศตะวันตก จุดวัดระดับน้ำทางเข้าออกนิคมฯ ประตู 3	1.ผอ.ควบคุมภาวะอุกเหิน 2.ทีมสื่อสารและประสานงาน 3.ทีมระงับเหตุ	1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ 3. จัดเตรียมสำรวจความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์
(สีเหลือง)	2 (เฝ้าระวัง) ตั้งแต่ +3.500 ถึง +4.500 MSL.	ทั้งนี้ ให้เฝ้าระวังติดตาม การผันน้ำจากภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ดังนี้ - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2 (อ.เมือง จ.นครสวรรค์) ใช้ระดับน้ำไม่เกิน +25.000 MSL. และปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท) ใช้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่เกิน +17.000 MSL. และปริมาณการระบายน้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.29 (อ.บางไทร จ.อยุธยา) ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	1.ผอ.ควบคุมภาวะอุกเหิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน	1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ 3. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ. 4. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ 5. จัดตั้งศูนย์ คออ. นิคมฯ
(สีส้ม)	3 (เสี่ยง) ตั้งแต่ +4.500 ถึง +5.100 MSL.	 - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท) ใช้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่เกิน +17.000 MSL. และปริมาณการระบายน้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.29 (อ.บางไทร จ.อยุธยา) ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	1.ผอ.ควบคุมภาวะอุกเหิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน 6.ทีม Utility 7.ทีมสนับสนุน	1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ 3. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ. 4. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ แจ้งชนย้ายทรัพย์สิน สารเคมีเก็บในที่ปลอดภัย 5. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและพิทักษ์ทรัพย์สิน 6. จัดหาสถานที่/เส้นทางอพยพ 7. เก็บของขึ้นที่สูง
(สีแดง)	4 (วิกฤต) ตั้งแต่ +5.100 MSL. ขึ้นไป หรือ กรณีเกิดเหตุอุกเหินอื่นๆ	หากเกินเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ น้ำจะเริ่มท่วมจาก อ่างทอง สิงห์บุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหรือคันป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ จะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าได้	1.ผอ.ควบคุมภาวะอุกเหิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน 6.ทีม Utility 7.ทีมสนับสนุน	1. ประกาศอพยพ 2. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ แจ้งผู้ประกอบการให้หยุดประกอบกิจการและแจ้งผู้นำชุมชนในศูนย์พักพิงอพยพออกนอกนิคมฯ 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและพิทักษ์ทรัพย์สิน 4. จัดหาสถานที่/อาหาร/เวชภัณฑ์ 5. จัดเตรียมศูนย์พยาบาลชั่วคราว

รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ข้อควรระวัง

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
1 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.68 MSL
2 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL
3 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL
4 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.85 MSL
5 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
6 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.25 MSL
7 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
8 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.17 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
9 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.09 MSL
10 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.45 MSL
11 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
12 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
13 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
14 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.52 MSL
15 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.48 MSL
16 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.39 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
17 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.57 MSL
18 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.51 MSL
19 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
20 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
21 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.11 MSL
22 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
23 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.18 MSL
24 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.25 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
25 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
26 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.29 MSL
27 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
28 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
29 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.45 MSL
30 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.64 MSL
31 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.70 MSL
1 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.65 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
2 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.51 MSL
3 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.05 MSL
4 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.15 MSL
5 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
6 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
7 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
8 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.35 MSL
9 สิงหาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.45 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
10 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.33 MSL
11 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
12 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.48 MSL
13 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.62 MSL
14 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.35 MSL
15 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
16 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.75 MSL
17 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.77 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
18 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.72 MSL
19 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.64 MSL
20 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.60 MSL
21 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.80 MSL
22 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.02 MSL
23 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.05 MSL
24 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.04 MSL
25 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.01 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
26 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.15 MSL
27 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
28 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.45 MSL
29 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.50 MSL
30 กันยายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.68 MSL
1 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.28 MSL
2 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.25 MSL
3 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.30 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
4 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.86 MSL
5 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.67 MSL
6 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.75 MSL
7 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.75 MSL
8 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.83 MSL
9 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.85 MSL
10 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.90 MSL
11 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.95 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
12 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.00 MSL
13 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.99 MSL
14 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.00 MSL
15 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.05 MSL
16 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.99 MSL
17 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.93 MSL
18 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.88 MSL
19 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.75 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
20 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.70 MSL
21 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.80 MSL
22 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.90 MSL
23 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.85 MSL
24 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.86 MSL
25 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.91 MSL
26 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.97 MSL
27 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.08 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
28 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.10 MSL
29 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.99 MSL
30 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.97 MSL
31 ตุลาคม 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.82 MSL
1 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.76 MSL
2 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.78 MSL
3 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.84 MSL
4 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.25 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
5 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.94 MSL
6 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.92 MSL
7 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.85 MSL
8 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.87 MSL
9 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.70 MSL
10 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.75 MSL
11 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.75 MSL
12 พฤศจิกายน 2566	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.60 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ





ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2566													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.40 MSL
	จ.นครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
1 ส.ค. 66	336	17.73	55	15.10	336	1.04	17	354.04	1,014	3.10	0.68	1.21	4.72
2 ส.ค. 66	310	16.10	55	15.00	310	1.04	18	329.04	987	3.16	0.90	0.22	4.50
3 ส.ค. 66	283	15.30	55	14.93	283	1.04	16	300.04	912	3.17	0.90	0.00	4.50
4 ส.ค. 66	252	14.43	55	14.73	252	1.04	18	271.04	131	3.15	0.85	-0.05	4.55
5 ส.ค. 66	240	14.59	55	14.59	240	1.04	18	259.04	176	3.10	0.50	-0.35	4.90
6 ส.ค. 66	228	16.22	55	14.45	228	1.04	9	238.04	234	3.03	0.25	-0.25	5.15
7 ส.ค. 66	228	17.19	55	14.33	228	1.04	9	238.04	155	2.91	0.20	-0.05	5.20
8 ส.ค. 66	234	17.22	55	14.22	234	1.04	9	244.04	181	2.80	0.17	-0.03	5.23
9 ส.ค. 66	238	17.24	55	14.17	238	2.60	9	249.60	141	2.72	0.09	-0.08	5.31
10 ส.ค. 66	236	17.23	55	14.10	236	2.61	9	247.61	134	2.65	0.45	0.36	4.95
11 ส.ค. 66	270	17.40	55	14.10	270	1.05	9	280.05	150	2.65	0.40	-0.05	5.00
12 ส.ค. 66	292	17.51	55	14.22	292	1.74	9	302.74	169	2.79	0.40	0.00	5.00
13 ส.ค. 66	318	17.64	55	14.37	318	1.75	9	328.75	183	2.87	0.40	0.00	5.00
14 ส.ค. 66	352	17.81	55	14.56	352	1.74	9	362.74	105	2.91	0.52	0.12	4.88
15 ส.ค. 66	350	17.80	55	14.76	350	1.75	9	360.75	125	2.93	0.48	-0.04	4.92
16 ส.ค. 65	360	17.85	55	14.95	360	1.74	9	370.74	155	2.94	0.39	-0.09	5.01



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2566

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.400 MSL
	จ.นครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
17 ส.ค. 66	320	17.65	55	15.01	320	1.74	9	330.74	137	2.95	0.57	0.18	4.83
18 ส.ค. 66	300	17.55	55	14.95	300	1.74	9	310.74	212	2.96	0.51	-0.06	4.89
19 ส.ค. 66	292	17.40	55	14.86	292	1.04	9	302.04	158	2.94	0.20	-0.31	5.20
20 ส.ค. 66	278	17.44	55	14.78	278	1.04	9	288.04	122	2.87	0.20	0.00	5.20
21 ส.ค. 66	268	17.39	55	14.72	268	1.04	9	278.04	140	2.76	0.11	-0.09	5.29
22 ส.ค. 66	266	17.35	55	14.67	266	1.04	9	276.04	131	2.69	0.30	0.19	5.10
23 ส.ค. 66	268	17.39	55	14.68	268	1.04	9	278.04	181	2.71	0.18	-0.12	5.22
24 ส.ค. 66	264	17.37	60	14.64	264	1.04	9	274.04	77	2.72	0.20	0.02	5.20
25 ส.ค. 66	245	17.3	55	14.60	245	1.04	9	255.04	90	2.71	0.20	0.00	5.20
26 ส.ค. 66	231	17.29	55	14.55	231	1.04	9	241.04	120	2.70	0.29	0.09	5.11
27 ส.ค. 66	222	17.25	55	14.51	222	1.04	9	232.04	167	2.81	0.30	0.01	5.10
28 ส.ค. 66	226	17.18	55	14.46	226	1.04	9	236.04	160	2.96	0.30	0.00	5.10
29 ส.ค. 66	246	17.28	50	14.46	246	1.04	9	256.04	178	3.07	0.45	0.15	4.95
30 ส.ค. 66	258	17.34	50	14.54	258	1.04	9	268.04	223	3.13	0.64	0.19	4.76
31 ส.ค. 66	264	17.37	50	14.63	264	1.04	9	274.04	108	3.15	0.70	0.06	4.70
1 ก.ย. 66	226	17.20	50	14.65	226	1.04	9	236.04	117	3.14	0.65	-0.05	4.75



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2566

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ทะลุนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.400 MSL
	จนท.สำรวจวัด ระดับตั้งแต่ +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
2 ก.ย. 66	238	17.24	50	14.58	238	1.04	9	248.04	245	3.10	0.51	-0.14	4.89
3 ก.ย. 66	231	17.12	50	14.43	231	1.04	9	241.04	123	3.03	0.05	-0.46	5.35
4 ก.ย. 66	224	17.23	50	14.57	224	1.04	9	234.04	135	2.96	0.15	0.10	5.25
5 ก.ย. 66	238	17.24	50	14.55	238	1.05	9	248.05	175	2.90	0.20	0.05	5.20
6 ก.ย. 66	252	17.35	50	14.62	252	1.05	9	262.05	183	2.86	0.20	0.00	5.20
7 ก.ย. 66	264	14.48	50	14.74	264	1.05	9	274.05	221	2.80	0.30	0.10	5.10
8 ก.ย. 66	300	17.55	50	14.89	300	1.05	10	311.05	189	2.72	0.35	0.05	5.05
9 ก.ย. 66	360	17.85	50	15.15	360	1.05	10	371.05	244	2.74	0.45	0.10	4.95
10 ก.ย. 66	400	18.01	50	15.45	400	1.05	10	411.05	187	2.80	0.33	-0.12	5.07
11 ก.ย. 66	512	18.48	80	15.78	512	1.05	10	523.05	263	2.87	0.40	0.07	5.00
12 ก.ย. 66	604	18.84	100	16.09	604	1.04	10	615.04	336	2.93	0.48	0.08	4.92
13 ก.ย. 66	625	18.92	120	16.45	625	1.04	11	637.04	267	2.96	0.62	0.14	4.78
14 ก.ย. 66	620	18.92	175	16.50	620	1.04	11	632.04	387	2.97	0.35	-0.27	5.05
15 ก.ย. 66	630	18.95	226	16.50	630	1.04	11	642.04	338	2.95	0.40	0.05	5.00
16 ก.ย. 66	657	19.04	254	16.50	657	1.04	11	669.04	412	2.90	0.75	0.35	4.65
17 ก.ย. 66	665	19.07	308	16.50	665	1.04	41	707.04	436	2.83	0.77	0.02	4.63



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2566

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับคลัง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
18 ก.ย. 66	735	19.31	380	16.50	735	0.45	41	776.45	453	2.76	0.72	-0.05	4.68
19 ก.ย. 66	905	19.90	450	16.49	905	0.44	58	963.44	652	2.73	0.64	-0.08	4.76
20 ก.ย. 66	1,098	20.50	689	16.50	1,098	0.40	20	1,118.40	873	2.76	0.60	-0.04	4.80
21 ก.ย. 66	1,212	20.85	700	16.60	1,212	0.44	89	1,301.44	923	2.79	0.80	0.20	4.60
22 ก.ย. 66	1,258	20.99	800	16.79	1,258	0.44	119	1,377.44	1,041	2.80	1.02	0.22	4.38
23 ก.ย. 66	1,258	20.99	898	16.63	1,258	0.44	113	1,371.44	1,247	2.77	1.05	0.03	4.35
24 ก.ย. 66	1,225	20.89	793	16.80	1,225	0.44	101	1,326.44	1,326	2.80	1.04	-0.01	4.36
25 ก.ย. 66	1,166	20.71	802	16.80	1,166	0.44	97	1,263.44	1,074	2.89	1.01	-0.03	4.39
26 ก.ย. 66	1,065	20.40	726	16.80	1,065	0.44	86	1,151.44	1,059	3.01	1.15	0.14	4.25
27 ก.ย. 66	960	20.08	653	16.80	960	0.44	87	1,047.44	1,100	3.09	1.10	-0.05	4.30
28 ก.ย. 66	908	19.91	516	16.75	908	0.44	187	1,095.44	840	3.13	1.45	0.35	3.95
29 ก.ย. 66	937	20.01	554	16.70	937	0.44	217	1,154.44	876	3.12	1.50	0.05	3.90
30 ก.ย. 66	1,055	20.37	804	16.50	1,055	0.44	192	1,247.44	979	3.07	1.68	0.18	3.72
1 ต.ค. 66	1,268	21.02	898	16.44	1,268	0.44	186	1,454.44	1,218	2.99	1.28	-0.40	4.12
2 ต.ค. 66	1,517	21.70	1,049	16.74	1,517	0.44	186	1,703.44	1,103	2.93	1.25	-0.40	4.15
3 ต.ค. 66	1,640	22.04	1,280	16.76	1,640	0.44	141	1,781.44	1,149	2.93	1.30	-0.40	4.10



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2566													
วัน/เดือน/ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับคลึง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
4 ต.ค. 66	1,673	22.13	1,449	16.49	1,673	0.44	149	1,822.44	1,359	2.92	1.86	0.56	3.54
5 ต.ค. 66	1,669	22.12	1,479	16.26	1,669	0.43	261	1,930.43	1,347	2.87	1.67	-0.19	3.73
6 ต.ค. 66	1,737	22.31	1,479	16.18	1,737	0.44	269	2,006.44	1,536	2.77	1.75	0.08	3.65
7 ต.ค. 66	1,820	22.54	1,479	16.42	1,820	0.43	259	2,079.43	1,562	2.77	1.75	0.00	3.65
8 ต.ค. 66	1,841	22.60	1,498	16.65	1,841	0.44	234	2,075.44	1,563	2.71	1.83	0.08	3.57
9 ต.ค. 66	1,806	22.50	1,498	16.80	1,806	0.44	192	1,998.44	1,550	2.79	1.85	0.02	3.55
10 ต.ค. 66	1,791	22.49	1,600	16.58	1,791	0.43	193	1,984.43	1,639	2.86	1.90	0.05	3.50
11 ต.ค. 66	1,777	22.42	1,600	16.58	1,777	0.44	203	1,980.44	1,731	2.90	1.95	0.05	3.45
12 ต.ค. 66	1,820	22.54	1,600	16.61	1,820	0.44	198	2,018.44	1,629	2.91	2.00	0.05	3.40
13 ต.ค. 66	1,967	22.95	1,650	16.78	1,967	4.34	192	2,163.34	1,753	2.88	1.99	-0.01	3.41
14 ต.ค. 66	2,036	23.11	1,800	16.77	2,036	4.32	181	2,221.32	1,516	2.81	2.00	0.01	3.40
15 ต.ค. 66	1,990	23.01	1,800	16.74	1,900	10.38	177	2,087.38	1,601	2.75	2.05	0.05	3.35
16 ต.ค. 66	1,960	22.93	1,800	16.57	1,960	10.38	201	2,171.38	1,578	2.72	1.99	-0.06	3.41
17 ต.ค. 66	1,960	22.93	1,650	16.52	1,960	8.68	211	2,179.68	1,595	2.94	1.93	-0.06	3.47
18 ต.ค. 66	2,041	23.12	1,650	16.75	2,041	6.95	167	2,214.95	1,553	2.98	1.88	-0.05	3.52
19 ต.ค. 66	2,153	23.36	1,650	16.98	2,153	6.94	139	2,298.94	1,500	2.97	1.75	-0.13	3.65



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2566													
วัน/เดือน/ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ	มีปริมาณ	ระดับน้ำ	ระดับน้ำของแม่น้ำ	ระดับน้ำ	คงเหลือระยะห่างจาก
	จนครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน	เขื่อน	เขื่อน	น้ำที่เขื่อน	มวลน้ำไหล	ทะเลหนุน	เจ้าพระยาหน้า	ขึ้น-ลงเทียบ	ระดับน้ำด้านนอกถึง
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL	เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	พระรามหก ลบ.ม/วินาที	ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	สูงสุด (เมตร)	เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	จากเมื่อวาน (เมตร)	หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.400 MSL
20 ต.ค. 66	2,167	23.39	1,690	17.00	2,167	8.68	126	2,301.68	1,459	2.93	1.70	-0.05	3.70
21 ต.ค. 66	2,078	23.20	1,731	17.00	2,078	8.68	122	2,208.68	1,534	2.88	1.80	0.10	3.60
22 ต.ค. 66	2,018	23.07	1,650	16.98	2,018	8.65	123	2,149.65	1,593	2.89	1.90	0.10	3.50
23 ต.ค. 66	1,974	22.97	1,650	16.88	1,974	12.98	125	2,111.98	1,544	2.94	1.85	-0.05	3.55
24 ต.ค. 66	1,931	22.85	1,650	16.78	1,931	13.05	159	2,103.05	1,512	3.01	1.86	0.01	3.54
25 ต.ค. 66	1,881	22.71	1,650	16.66	1,881	17.32	131	2,029.32	1,447	3.05	1.91	0.05	3.49
26 ต.ค. 66	1,816	22.53	1,621	16.50	1,816	21.66	155	1,992.66	1,407	3.06	1.97	0.06	3.43
27 ต.ค. 66	1,770	22.40	1,509	16.50	1,770	25.92	168	1,963.92	1,516	3.04	2.08	0.11	3.32
28 ต.ค. 66	1,770	22.40	1,421	16.50	1,770	21.65	253	2,044.65	1,429	2.98	2.10	0.02	3.30
29 ต.ค. 66	1,770	22.41	1,449	16.53	1,770	17.32	251	2,038.32	1,530	2.98	1.99	-0.11	3.41
30 ต.ค. 66	1,744	22.33	1,427	16.52	1,744	17.34	203	1,964.34	1,399	3.10	1.97	-0.02	3.43
31 ต.ค. 66	1,838	22.59	1,490	16.41	1,838	17.36	198	2,053.36	1,332	3.12	1.82	-0.15	3.58
1 พ.ย. 66	1,971	22.96	1,490	16.81	1,971	17.35	210	2,198.35	1,139	3.08	1.76	-0.06	3.64
2 พ.ย. 66	2,148	23.35	1,629	17.00	2,148	17.34	211	2,376.34	1,236	3.01	1.78	0.02	3.62
3 พ.ย. 66	2,233	23.53	1,792	17.01	2,233	12.98	207	2,452.98	1,390	2.95	1.84	0.06	3.56
4 พ.ย. 66	2,106	23.26	1,763	17.00	2,106	8.69	185	2,299.69	1,574	2.90	2.25	0.41	3.15

[illegible][illegible]



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำย้อนหลังในปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณสูงสุด



ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง			
ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำที่ระบายทั้ง 3 เขื่อนสูงสุด (ลบ.ม./วินาที)	มีมวลน้ำที่ไหลผ่านนิคมบ้านหว้า (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงสุด Intake (MSL)
2553	5,718 (24 ต.ค.53)	3,526 (29 ต.ค.53)	4.01 (31 ต.ค.56)
2554	5,893 (6,8 ต.ค.54)	3,860 (15 ต. ค.54)	4.90 (15 ต. ค.54)
2555	1,643 (5 ต.ค.55)	1,764 (5 ต.ค.55)	2.00 (5 ต.ค.55)
2556	1,480 (31 ต.ค.56)	1,502 (31 ต.ค.56)	2.30 (31 ต.ค.56)
2557	255.89 (17 ต.ค.57)	645 (17 ต.ค.57)	0.00 (17 ต.ค.57)
2558	-	-	-
2559	3,083.54 (11 ต.ค.59)	2,172 (11 ต.ค.59)	1.39 (11 ต.ค.59)
2560	3,584.29 (22 ต.ค.60)	2,696 (22 ต.ค.60)	2.95 (22 ต.ค.60)
2561	1,614.34 (18 ก.ย.61)	841 (11 ก.ย. 61)	1.42 (11 ก.ย.61)
2562	1,545.75 (9 ก.ย.62)	889 (8 ก.ย.62)	1.39 (29 ก.ย.62)
2563	1252.00 (8 ต.ค.63)	795 (13 ต.ค.63)	1.10 (24 ต.ค.63)
2564	3,521.72 (30 ก.ย.64)	3,252 (24 ต.ค.64)	3.80 (4 ต.ค.64)
2565	4,029.42 (8 ต.ค. 65)	3,218 (4 ต.ค. 65)	3.90 (14 ต.ค. 65)
2566	1,455.70 ลบ.ม./วินาที (12 พ.ย. 66)	1,213 ลบ.ม./วินาที (12 พ.ย. 66)	1.60 MSL (12 พ.ย. 66)



นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

รายงานสถานการณ์น้ำรอบนิคมฯบ้านหว้า (ไฮเทค)

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

วันนี้
ระดับน้ำห่างจากหลังคันป้องกัน
น้ำท่วมนิคมฯ 3.80 MSL

สถานีสูบน้ำ ปัม 5 ตัว

อัตราสูบ 10,800 ลบ.ม./ชม.

รวมความสามารถในการ
สูบน้ำ 54,000 ลบ.ม./ชม.

เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ

ความสูง +5.40 MSL.

สันกว้าง 2.50 ม. ฐานกว้าง
10.60 ม. ความยาว 11 กม.

ระดับน้ำจุดตรวจวัดรอบเขื่อน

ฝักระวัง

+2.50 MSL

แม่น้ำเจ้าพระยา

ระดับน้ำ +1.60 MSL

แม่น้ำเจ้าพระยา

ระดับถนนภายในนิคมฯ +2.300 MSL

ระดับน้ำ ณ จุดฝักระวังใกล้นิคมฯ เทียบกับระดับสูงของสันเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ

นิคมอุตสาหกรรม	ระดับน้ำ ณ ทุกทิศ	ระดับสันเขื่อนป้องกันน้ำท่วม	ระยะห่างคงเหลือ
	เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วม	รอบโครงการ	MSL
	MSL	MSL	
บ้านหว้า	+2.50	5.40	2.90

เขื่อนเจ้าพระยา (C.13)

1,070 ลบ.ม./วินาที

เขื่อนพระราม 6

113 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำไหลผ่านนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) อ.บางไทร C.29A

เฉลี่ย 1,213 ลบ.ม./วินาที

ค่าเกณฑ์ฝักระวัง

เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ระดับ 1 (ปกติ) น้อยกว่า 3.500 MSL.	ระดับ 2 (ฝักระวัง) ตั้งแต่ +3.500 ถึง +4.500 MSL.	ระดับ 3 (เสี่ยง) ตั้งแต่ +4.500 ถึง +5.100 MSL.	ระดับ 4 (วิกฤต) ตั้งแต่ + 5.100 MSL.ขึ้นไป

สัญลักษณ์เตือนภัย

ปกติ
