


รายงานสถานการณ์น้ำ

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568



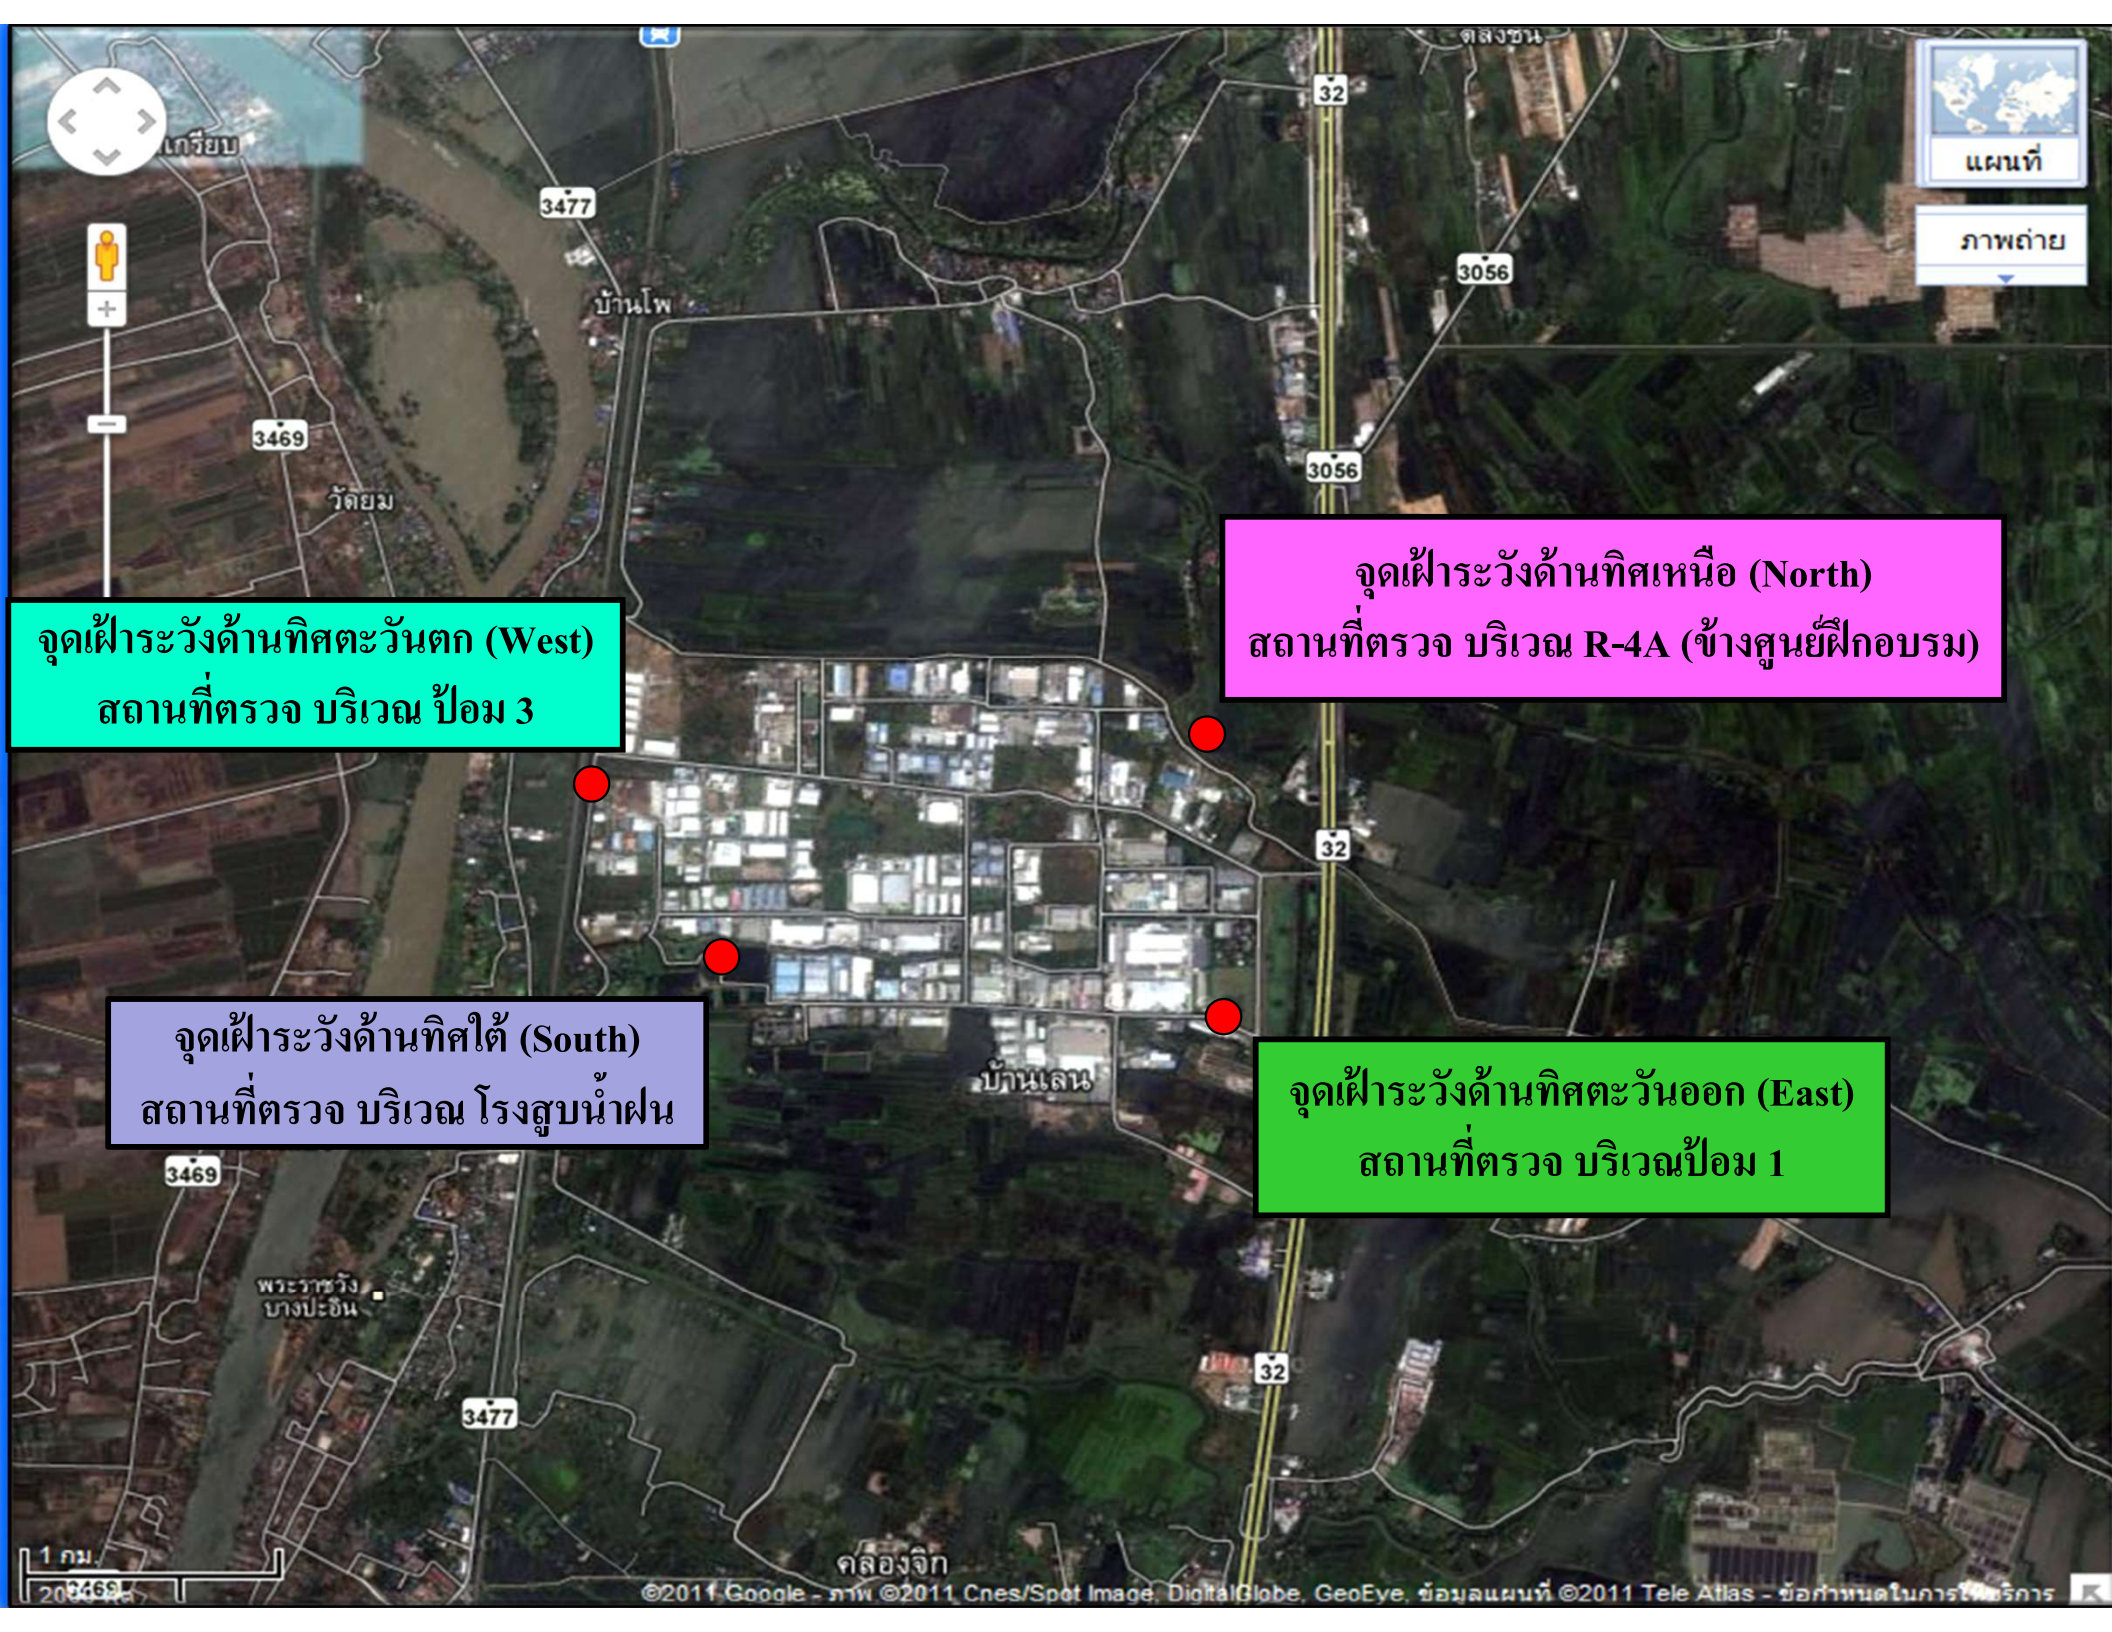

แผนที่

ภาพถ่าย

จุดเฝ้าระวังด้านทิศตะวันตก (West)
สถานที่ตรวจ บริเวณ ป้อม 3

จุดเฝ้าระวังด้านทิศเหนือ (North)
สถานที่ตรวจ บริเวณ R-4A (ข้างศูนย์ฝึกอบรบ)

จุดเฝ้าระวังด้านทิศใต้ (South)
สถานที่ตรวจ บริเวณ โรงสูบน้ำฝน

จุดเฝ้าระวังด้านทิศตะวันออก (East)
สถานที่ตรวจ บริเวณ ป้อม 1

1 กม.
200 เมตร

เกณฑ์กำหนดการเตือนภัย (อุทกภัย)

สัญลักษณ์เตือนภัย	เกณฑ์/ระดับน้ำนอกคัน	จุดเฝ้าระวัง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
(สีเขียว)	1 (ปกติ) น้อยกว่า 3.500 MSL.	1. ทิศเหนือ จุดวัดระดับน้ำด้านหลังศูนย์เทคโนโลยี 2. ทิศใต้ จุดวัดระดับน้ำด้านหลังสถานีสูบน้ำฝนนิคมฯ 3. ทิศตะวันออก จุดวัดระดับน้ำทางเข้าออกนิคมฯ ประตู 1 4. ทิศตะวันตก จุดวัดระดับน้ำทางเข้าออกนิคมฯ ประตู 3	1.ผอ.ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2.ทีมสื่อสารและประสานงาน 3.ทีมระงับเหตุ	1.ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2.ตรวจเชื่อนดิน/ระดับน้ำ 3.จัดเตรียมสำรวจความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์
(สีเหลือง)	2 (เฝ้าระวัง) ตั้งแต่ +3.500 ถึง +4.500 MSL.	ทั้งนี้ ให้เฝ้าระวังติดตาม การผันน้ำจากภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ดังนี้ - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2 (อ.เมือง จ.นครสวรรค์) ใช้ระดับน้ำไม่เกิน +25.000 MSL. และปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท) ใช้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่เกิน +17.000 MSL. และปริมาณการระบายน้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.29 (อ.บางไทร จ.อยุธยา) ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	1.ผอ.ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน	1.ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2.ตรวจเชื่อนดิน/ระดับน้ำ 3.รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ. 4.สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ 5.จัดตั้งศูนย์ คออ. นิคมฯ
(สีส้ม)	3 (เสี่ยง) ตั้งแต่ +4.500 ถึง +5.100 MSL.	 - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท) ใช้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่เกิน +17.000 MSL. และปริมาณการระบายน้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.29 (อ.บางไทร จ.อยุธยา) ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	1.ผอ.ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน 6.ทีม Utility 7.ทีมสนับสนุน	1.ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2.ตรวจเชื่อนดิน/ระดับน้ำ 3.รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ. 4.สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ แจ้งขนย้ายทรัพย์สิน สารเคมีเก็บในที่ปลอดภัย 5.อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและพิทักษ์ทรัพย์สิน 6.จัดหาสถานที่/เส้นทางอพยพ 7.เก็บของขึ้นที่สูง
(สีแดง)	4 (วิกฤต) ตั้งแต่ +5.100 MSL. ขึ้นไป หรือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ	หากเกินเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ น้ำจะเริ่มท่วมจาก อ่างทอง สิงห์บุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหรือคันป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ จะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าได้	1.ผอ.ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน 6.ทีม Utility 7.ทีมสนับสนุน	1.ประกาศอพยพ 2.สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ แจ้งผู้ประกอบการให้หยุดประกอบกิจการและแจ้งผู้นำชุมชนในศูนย์พักพิงอพยพออกนอกนิคมฯ 3.อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและพิทักษ์ทรัพย์สิน 4.จัดหาสถานที่/อาหาร/เวชภัณฑ์ 5.จัดเตรียมศูนย์พยาบาลชั่วคราว

รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา ส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน อ่าวไทย และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่าง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก รวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่

สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
1 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.25 MSL
2 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.25 MSL
3 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.30 MSL
4 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
5 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.20 MSL
6 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
7 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.15 MSL
8 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.20 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
9 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.15 MSL
10 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
11 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.25 MSL
12 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
13 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
14 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
15 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
16 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
17 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.05 MSL
18 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
19 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.40 MSL
20 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.50 MSL
21 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.70 MSL
22 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.75 MSL
23 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.85 MSL
24 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.70 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
25 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.62 MSL
26 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.70 MSL
27 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.65 MSL
28 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.60 MSL
29 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.55 MSL
30 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.50 MSL
31 สิงหาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.45 MSL
1 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.42 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
2 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.50 MSL
3 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.60 MSL
4 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.65 MSL
5 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.00 MSL
6 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.25 MSL
7 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.25 MSL
8 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.35 MSL
9 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.30 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
10 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.42 MSL
11 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.55 MSL
12 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL
13 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.60 MSL
14 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.60 MSL
15 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.60 MSL
16 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.55 MSL
17 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.55 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
18 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.60 MSL
19 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.70 MSL
20 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.85 MSL
21 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.85 MSL
22 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.90 MSL
23 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.85 MSL
24 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.90 MSL
25 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.70 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
26 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.75 MSL
27 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.85 MSL
28 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.85 MSL
29 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.90 MSL
30 กันยายน 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL
1 ตุลาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL
2 ตุลาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+3.05 MSL
3 ตุลาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
4 ตุลาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL
5 ตุลาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+3.30 MSL
6 ตุลาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+3.30 MSL
7 ตุลาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+3.20 MSL
8 ตุลาคม 2568	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.90 MSL	+2.55 MSL	+3.15 MSL
9 ตุลาคม 2568	+2.75 MSL	+2.50 MSL	+2.96 MSL	+2.60 MSL	+3.15 MSL
10 ตุลาคม 2568	+2.75 MSL	+2.50 MSL	+3.01 MSL	+2.60 MSL	+2.95 MSL
11 ตุลาคม 2568	+2.75 MSL	+2.50 MSL	+3.02 MSL	+2.60 MSL	+2.70 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
12 ตุลาคม 2568	+2.77 MSL	+2.50 MSL	+3.02 MSL	+2.58 MSL	+2.70 MSL
13 ตุลาคม 2568	+2.77 MSL	+2.50 MSL	+3.01 MSL	+2.63 MSL	+2.65 MSL
14 ตุลาคม 2568	+2.77 MSL	+2.50 MSL	+3.07 MSL	+2.63 MSL	+2.75 MSL
15 ตุลาคม 2568	+2.82 MSL	+2.50 MSL	+3.10 MSL	+2.65 MSL	+2.80 MSL
16 ตุลาคม 2568	+2.83 MSL	+2.55 MSL	+3.11 MSL	+2.68 MSL	+2.90 MSL
17 ตุลาคม 2568	+2.84 MSL	+2.50 MSL	+3.12 MSL	+2.69 MSL	+2.95 MSL
18 ตุลาคม 2568	+2.85 MSL	+2.50 MSL	+3.14 MSL	+2.70 MSL	+3.00 MSL
19 ตุลาคม 2568	+2.85 MSL	+2.50 MSL	+3.14 MSL	+2.70 MSL	+2.85 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
20 ตุลาคม 2568	+2.85 MSL	+2.50 MSL	+3.14 MSL	+2.70 MSL	+2.90 MSL
21 ตุลาคม 2568	+2.86 MSL	+2.50 MSL	+3.14 MSL	+2.70 MSL	+3.00 MSL
22 ตุลาคม 2568	+2.86 MSL	+2.50 MSL	+3.14 MSL	+2.70 MSL	+3.10 MSL
23 ตุลาคม 2568	+2.86 MSL	+2.50 MSL	+3.14 MSL	+2.70 MSL	+2.90 MSL
24 ตุลาคม 2568	+2.86 MSL	+2.50 MSL	+3.13 MSL	+2.70 MSL	+2.95 MSL
25 ตุลาคม 2568	+2.86 MSL	+2.50 MSL	+3.13 MSL	+2.70 MSL	+2.90 MSL
26 ตุลาคม 2568	+2.86 MSL	+2.50 MSL	+3.13 MSL	+2.70 MSL	+2.80 MSL
27 ตุลาคม 2568	+2.86 MSL	+2.50 MSL	+3.12 MSL	+2.70 MSL	+2.75 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL




สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
28 ตุลาคม 2568	+2.82 MSL	+2.50 MSL	+3.11 MSL	+2.68 MSL	+2.90 MSL
29 ตุลาคม 2568	+2.80 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL	+2.65 MSL	+2.70 MSL
30 ตุลาคม 2568	+2.80 MSL	+2.50 MSL	+3.08 MSL	+2.65 MSL	+2.75 MSL
31 ตุลาคม 2568	+2.70 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL	+2.60 MSL	+2.40 MSL
1 พฤศจิกายน 2568	+2.70 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL	+2.60 MSL	+2.50 MSL
2 พฤศจิกายน 2568	+2.70 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL	+2.60 MSL	+2.45 MSL
3 พฤศจิกายน 2568	+2.70 MSL	+2.50 MSL	+3.00 MSL	+2.60 MSL	+2.50 MSL
4 พฤศจิกายน 2568	+2.72 MSL	+2.50 MSL	+3.01 MSL	+2.61 MSL	+2.90 MSL


หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯไฮเทค
ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL
Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
5 พฤศจิกายน 2568	+2.72 MSL	+2.50 MSL	+3.02 MSL	+2.62 MSL	+2.95 MSL
6 พฤศจิกายน 2568					
7 พฤศจิกายน 2568					
8 พฤศจิกายน 2568					
9 พฤศจิกายน 2568					
10 พฤศจิกายน 2568					
11 พฤศจิกายน 2568					
12 พฤศจิกายน 2568					

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL





ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไธเทศ) ประจำปี 2568

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29 A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.40 MSL
	จ.นครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25.00 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17.00 MSL									
1 ส.ค. 68	1,281	20.77	1,050	14.92	1,050	1.30	9	1,060.30	844	2.82	1.25	1.21	4.15
2 ส.ค. 68	1,253	20.68	1,050	14.58	1,050	1.30	9	1,060.30	772	2.73	1.25	0.00	4.15
3 ส.ค. 68	1,230	20.61	1,000	14.35	1,000	1.30	9	1,010.30	754	2.63	1.30	0.05	4.10
4 ส.ค. 68	1,196	20.5	900	14.52	900	2.60	9	911.60	823	2.65	1.10	-0.20	4.30
5 ส.ค. 68	1,170	20.42	800	15.04	800	2.60	0	802.60	751	2.82	1.20	0.10	4.20
6 ส.ค. 68	1,161	20.39	700	15.50	700	4.33	0	704.33	776	3.02	1.10	-0.10	4.30
7 ส.ค. 68	1,157	20.38	700	15.75	700	4.32	0	704.32	706	3.14	1.15	0.05	4.25
8 ส.ค. 68	1,148	20.35	750	15.65	750	4.32	10	764.32	655	3.21	1.20	0.05	4.20
9 ส.ค. 68	1,148	20.35	750	15.64	750	2.60	10	762.60	695	3.24	1.15	-0.05	4.25
10 ส.ค. 68	1,151	20.36	750	15.62	750	2.60	9	761.60	659	3.22	1.00	-0.15	4.40
11 ส.ค. 68	1,148	20.35	750	15.62	750	1.30	10	761.30	669	3.18	1.25	0.25	4.15
12 ส.ค. 68	1,167	20.41	750	15.64	750	1.30	10	761.30	751	3.12	1.10	-0.15	4.30
13 ส.ค. 68	1,211	20.55	750	15.71	750	1.30	10	761.30	676	3.05	1.10	0.00	4.30
14 ส.ค. 68	1,249	20.67	800	15.72	800	1.30	9	810.30	684	3.00	1.10	0.00	4.30
15 ส.ค. 68	1,253	20.68	850	15.76	850	1.30	9	860.30	644	2.96	1.10	0.00	4.30
16 ส.ค. 68	1,275	20.75	850	15.78	850	1.30	9	860.30	689	2.93	1.10	0.00	4.30



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไสเทค) ประจำปี 2568

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29 A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.40 MSL
	จ.นครสวรรค์		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ระดับตลิ่ง +2.6200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา										
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25.00 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17.00 MSL									
17 ส.ค. 68	1,351	20.99	900	15.84	900	1.30	9	910.30	817	2.89	1.05	0.00	4.35
18 ส.ค. 68	1,488	21.40	1,050	15.73	1,050	1.30	9	1,060.30	840	2.84	1.10	0.05	4.30
19 ส.ค. 68	1,551	21.59	1,150	15.72	1,150	1.30	9	1,160.30	841	2.99	1.40	0.30	4.00
20 ส.ค. 68	1,548	21.55	1,200	15.72	1,200	1.30	9	1,210.30	977	3.17	1.50	0.10	3.90
21 ส.ค. 68	1,554	21.60	1,250	15.52	1,250	1.30	9	1,260.30	1,147	3.26	1.70	0.20	3.70
22 ส.ค. 68	1,574	21.66	1,200	15.68	1,200	1.31	9	1,210.31	1,197	3.27	1.75	0.05	3.65
23 ส.ค. 68	1,581	21.68	1,250	15.63	1,250	1.30	9	1,260.30	1,080	2.23	1.85	0.10	3.55
24 ส.ค. 68	1,598	21.73	1,300	15.49	1,300	1.30	9	1,310.30	1,065	3.16	1.70	-0.15	3.70
25 ส.ค. 68	1,605	21.75	1,300	15.42	1,300	1.30	14	1,315.30	1,110	3.11	1.62	-0.08	3.78
26 ส.ค. 68	1,615	21.78	1,300	15.55	1,300	1.30	32	1,333.30	1,082	3.07	1.70	0.08	3.70
27 ส.ค. 68	1,598	21.73	1,300	15.55	1,300	1.30	32	1,333.30	1,185	3.03	1.65	-0.05	3.75
28 ส.ค. 68	1,578	21.67	1,300	15.47	1,300	1.30	36	1,337.30	1,104	2.97	1.60	-0.05	3.80
29 ส.ค. 68	1,568	21.64	1,300	15.32	1,300	2.59	44	1,346.59	1,058	2.90	1.55	-0.05	3.85
30 ส.ค. 68	1,574	21.66	1,300	15.20	1,300	3.90	60	1,363.90	1,119	2.82	1.50	-0.05	3.90
31 ส.ค. 68	1,591	21.71	1,300	15.13	1,300	5.21	60	1,365.21	1,132	2.73	1.45	-0.05	3.95
1 ก.ย. 68	1,628	21.82	1,300	15.09	1,300	8.64	59	1,367.64	1,081	2.67	1.42	-0.03	3.98



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮทก) ประจำปี 2568

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ	มีปริมาณ	ระดับน้ำ	ระดับน้ำของแม่น้ำ	ระดับน้ำ	คงเหลือระยะห่างจาก
	จ.นครสวรรค์		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน	เขื่อน	เขื่อน	น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29 A	ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.40 MSL
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25.00 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17.00 MSL									
4 Oct 68	2,805	24.51	2,500	16.22	เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที	ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	พระรามหก ลบ.ม/วินาที	3,137.23	2,598	3.09	3.00	0.00	2.40
5 Oct 68	2,776	24.46	2,500	16.23	2,500	38.90	594	3,132.90	2,474	3.07	3.30	0.30	2.10
6 Oct 68	2,748	24.41	2,500	16.12	2,500	38.91	562	3,100.91	2,421	3.04	3.30	0.00	2.10
7 Oct 68	2,753	24.42	2,400	16.03	2,400	30.28	506	2,936.28	2,389	3.00	3.20	-0.10	2.20
8 Oct 68	2,759	24.43	2,400	15.94	2,400	25.95	416	2,841.95	2,428	2.98	3.15	-0.05	2.25
9 Oct 68	2,719	24.36	2,300	15.95	2,300	21.62	330	2,651.62	2,629	3.16	3.15	0.00	2.25
10 Oct 68	2,696	24.32	2,300	15.47	2,300	17.35	281	2,598.35	2,462	3.25	2.95	-0.20	2.45
11 Oct 68	2,667	24.27	2,300	16.07	2,300	17.34	235	2,552.34	2,360	3.25	2.70	-0.25	2.70
12 Oct 68	2,645	24.23	2,300	16.05	2,300	13.03	235	2,548.03	2,264	3.19	2.70	0.00	2.70
13 Oct 68	2,639	24.22	2,300	16.07	2,300	8.66	221	2,529.66	2,123	3.13	2.65	-0.05	2.75
14 Oct 68	2,645	24.23	2,300	15.47	2,300	8.65	197	2,505.65	2,171	3.10	2.75	0.10	2.65
15 Oct 68	2,673	24.28	2,300	15.47	2,300	12.96	186	2,498.96	2,094	3.10	2.80	0.05	2.60
16 Oct 68	2,742	24.40	2,300	14.47	2,300	17.29	186	2,503.29	2,099	3.10	2.90	0.10	2.50
17 Oct 68	2,776	24.46	2,400	15.70	2,400	17.33	201	2,618.33	2,192	3.07	2.95	0.05	2.45
18 Oct 68	2,839	24.57	2,400	15.70	2,400	17.36	202	2,619.36	2,112	3.04	3.00	0.05	2.40
19 Oct 68	2,845	24.58	2,500	15.94	2,500	17.33	202	2,719.33	2,140	3.00	2.85	-0.15	2.55



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2568

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29 A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.40 MSL
	จ.นครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25.00 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17.00 MSL									
4 Oct 68	2,805	24.51	2,500	16.22	2,500	43.23	594	3,137.23	2,598	3.09	3.00	0.00	2.40
5 Oct 68	2,776	24.46	2,500	16.23	2,500	38.90	594	3,132.90	2,474	3.07	3.30	0.30	2.10
6 Oct 68	2,748	24.41	2,500	16.12	2,500	38.91	562	3,100.91	2,421	3.04	3.30	0.00	2.10
7 Oct 68	2,753	24.42	2,400	16.03	2,400	30.28	506	2,936.28	2,389	3.00	3.20	-0.10	2.20
8 Oct 68	2,759	24.43	2,400	15.94	2,400	25.95	416	2,841.95	2,428	2.98	3.15	-0.05	2.25
9 Oct 68	2,719	24.36	2,300	15.95	2,300	21.62	330	2,651.62	2,629	3.16	3.15	0.00	2.25
10 Oct 68	2,696	24.32	2,300	15.47	2,300	17.35	281	2,598.35	2,462	3.25	2.95	-0.20	2.45
11 Oct 68	2,667	24.27	2,300	16.07	2,300	17.34	235	2,552.34	2,360	3.25	2.70	-0.25	2.70
12 Oct 68	2,645	24.23	2,300	16.05	2,300	13.03	235	2,548.03	2,264	3.19	2.70	0.00	2.70
13 Oct 68	2,639	24.22	2,300	16.07	2,300	8.66	221	2,529.66	2,123	3.13	2.65	-0.05	2.75
14 Oct 68	2,645	24.23	2,300	15.47	2,300	8.65	197	2,505.65	2,171	3.10	2.75	0.10	2.65
15 Oct 68	2,673	24.28	2,300	15.47	2,300	12.96	186	2,498.96	2,094	3.10	2.80	0.05	2.60
16 Oct 68	2,742	24.40	2,300	14.47	2,300	17.29	186	2,503.29	2,099	3.10	2.90	0.10	2.50
17 Oct 68	2,776	24.46	2,400	15.70	2,400	17.33	201	2,618.33	2,192	3.07	2.95	0.05	2.45
18 Oct 68	2,839	24.57	2,400	15.70	2,400	17.36	202	2,619.36	2,112	3.04	3.00	0.05	2.40
19 Oct 68	2,845	24.58	2,500	15.94	2,500	17.33	201	2,718.33	2,140	3.00	2.85	-0.15	2.55



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2568

วัน เดือน ปี	สถานีนี้ตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีนี้ตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29 A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.40 MSL
	จ.นครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25.00 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3,000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17.00 MSL									
20 Oct 68	2,850	24.59	2,500	15.94	2,500	17.35	201	2,718.35	2,202	3.00	2.90	0.05	2.50
21 Oct 68	2,839	24.57	2,500	16.65	2,500	17.36	200	2,717.36	2,272	2.95	3.00	0.10	2.40
22 Oct 68	2,816	24.53	2,500	16.61	2,500	17.36	200	2,717.36	2,231	3.02	3.10	0.10	2.30
23 Oct 68	2,782	24.47	2,500	16.46	2,500	17.33	199	2,716.33	2,178	3.10	2.90	-0.20	2.50
24 Oct 68	2,753	24.42	2,500	16.30	2,500	17.33	196	2,713.33	2,162	3.15	2.95	0.05	2.45
25 Oct 68	2,713	24.36	2,400	16.31	2,400	13.00	195	2,608.00	2,071	3.14	2.90	-0.05	2.50
26 Oct 68	2,656	24.25	2,400	16.23	2,400	8.68	170	2,578.68	2,074	3.11	2.80	-0.10	2.60
27 Oct 68	2,587	24.13	2,400	16.01	2,400	4.34	139	2,543.34	2,153	3.07	2.75	-0.05	2.65
28 Oct 68	2,524	24.02	2,300	15.93	2,300	4.34	71	2,375.34	2,035	3.03	2.90	0.15	2.50
29 Oct 68	2,460	23.88	2,200	15.81	2,200	4.34	42	2,246.34	1,982	3.01	2.70	-0.20	2.70
30 Oct 68	2,412	23.77	2,100	15.97	2,100	2.16	11	2,113.16	1,904	3.01	2.75	0.05	2.65
31 Oct 68	2,382	23.70	2,000	16.21	2,000	2.16	11	2,013.16	1,902	3.00	2.40	-0.35	3.00
1 Nov 68	2,342	23.61	2,000	16.26	2,000	2.17	10	2,012.17	1,936	2.98	2.50	0.10	2.90
2 Nov 68	2,368	23.67	2,000	16.56	2,000	2.17	11	2,013.17	1,937	2.95	2.45	-0.05	2.95
3 Nov 68	2,500	23.97	2,100	16.92	2,100	2.17	93	2,195.17	2,290	2.98	2.50	0.05	2.90
4 Nov 68	2,673	24.67	2,300	17.02	2,300	6.52	181	2,487.52	2,031	2.90	2.90	0.40	2.50



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำย้อนหลังในปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณสูงสุด



ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง			
ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำที่ระบายทั้ง 3 เขื่อนสูงสุด (ลบ.ม./วินาที)	มีมวลน้ำที่ไหลผ่านนิคมฯบ้านห้วย (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงสุด Intake (MSL)
2553	5,718 (24 ต.ค.53)	3,526 (29 ต.ค.53)	4.01 (31 ต.ค.56)
2554	5,893 (6,8 ต.ค.54)	3,860 (15 ต. ค.54)	4.90 (15 ต. ค.54)
2555	1,643 (5 ต.ค.55)	1,764 (5 ต.ค.55)	2.00 (5 ต.ค.55)
2556	1,480 (31 ต.ค.56)	1,502 (31 ต.ค.56)	2.30 (31 ต.ค.56)
2557	255.89 (17 ต.ค.57)	645 (17 ต.ค.57)	0.00 (17 ต.ค.57)
2558	-	-	-
2559	3,083.54 (11 ต.ค.59)	2,172 (11 ต.ค.59)	1.39 (11 ต.ค.59)
2560	3,584.29 (22 ต.ค.60)	2,696 (22 ต.ค.60)	2.95 (22 ต.ค.60)
2561	1,614.34 (18 ก.ย.61)	841 (11 ก.ย. 61)	1.42 (11 ก.ย.61)
2562	1,545.75 (9 ก.ย.62)	889 (8 ก.ย.62)	1.39 (29 ก.ย.62)
2563	1252.00 (8 ต.ค.63)	795 (13 ต.ค.63)	1.10 (24 ต.ค.63)
2564	3,521.72 (30 ก.ย.64)	3,252 (24 ต.ค.64)	3.80 (4 ต.ค.64)
2565	4,029.42 (8 ต.ค. 65)	3,218 (4 ต.ค. 65)	3.90 (14 ต.ค. 65)
2566	2452.98 (13 พ.ย. 66)	1753 (13 ต.ค. 66)	1.98 MSL (4 พ.ย. 66)
2567	2,515.01 ลบ.ม./วินาที (7 ต.ค. 67)	1,990 ลบ.ม./วินาที (7 ต.ค. 67)	2.50 MSL (7 ต.ค.67)
2568	2,767.31 ลบ.ม./วินาที (5 พ.ย. 68)	2,116 ลบ.ม./วินาที (5 พ.ย. 68)	2.95 MSL (5 พ.ย.68)



นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

รายงานสถานการณ์น้ำรอบนิคมฯบ้านหว้า (ไฮเทค)

ประจำวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568



ระดับถนนภายในนิคมฯ + 2.300 MSL

ระดับน้ำ ณ จุดฝักระวังใกล้นิคมฯ เทียบกับระดับสูงของสันเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ

นิคมอุตสาหกรรม	ระดับน้ำ ณ ทิศตะวันออก	ระดับสันเขื่อนป้องกันน้ำท่วม	ระยะห่างคงเหลือ
	เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วม	รอบโครงการ	
	MSL (1)	MSL (2)	MSL (2) - (1)
บ้านหว้า	+3.02	5.40	2.38

- ❖ เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 2,500 ลบ.ม./วินาที
- ❖ เขื่อนพระราม 6 250 ลบ.ม./วินาที
- ❖ ปริมาณน้ำไหลผ่านนิคมฯ บ้านหว้า(ไฮเทค) อ.บางไทร C.29A เฉลี่ย 2,116 ลบ.ม./วินาที

ค่าเกณฑ์ฝักระวัง

เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ระดับ 1 (ปกติ) น้อยกว่า 3.500 MSL.	ระดับ 2 (ฝักระวัง) ตั้งแต่ +3.500 ถึง +4.500 MSL.	ระดับ 3 (เสี่ยง) ตั้งแต่ +4.500 ถึง +5.100 MSL.	ระดับ 4 (วิกฤต) ตั้งแต่ + 5.100 MSL.ขึ้นไป

สัญลักษณ์เตือนภัย

ปกติ
