


รายงานสถานการณ์

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563



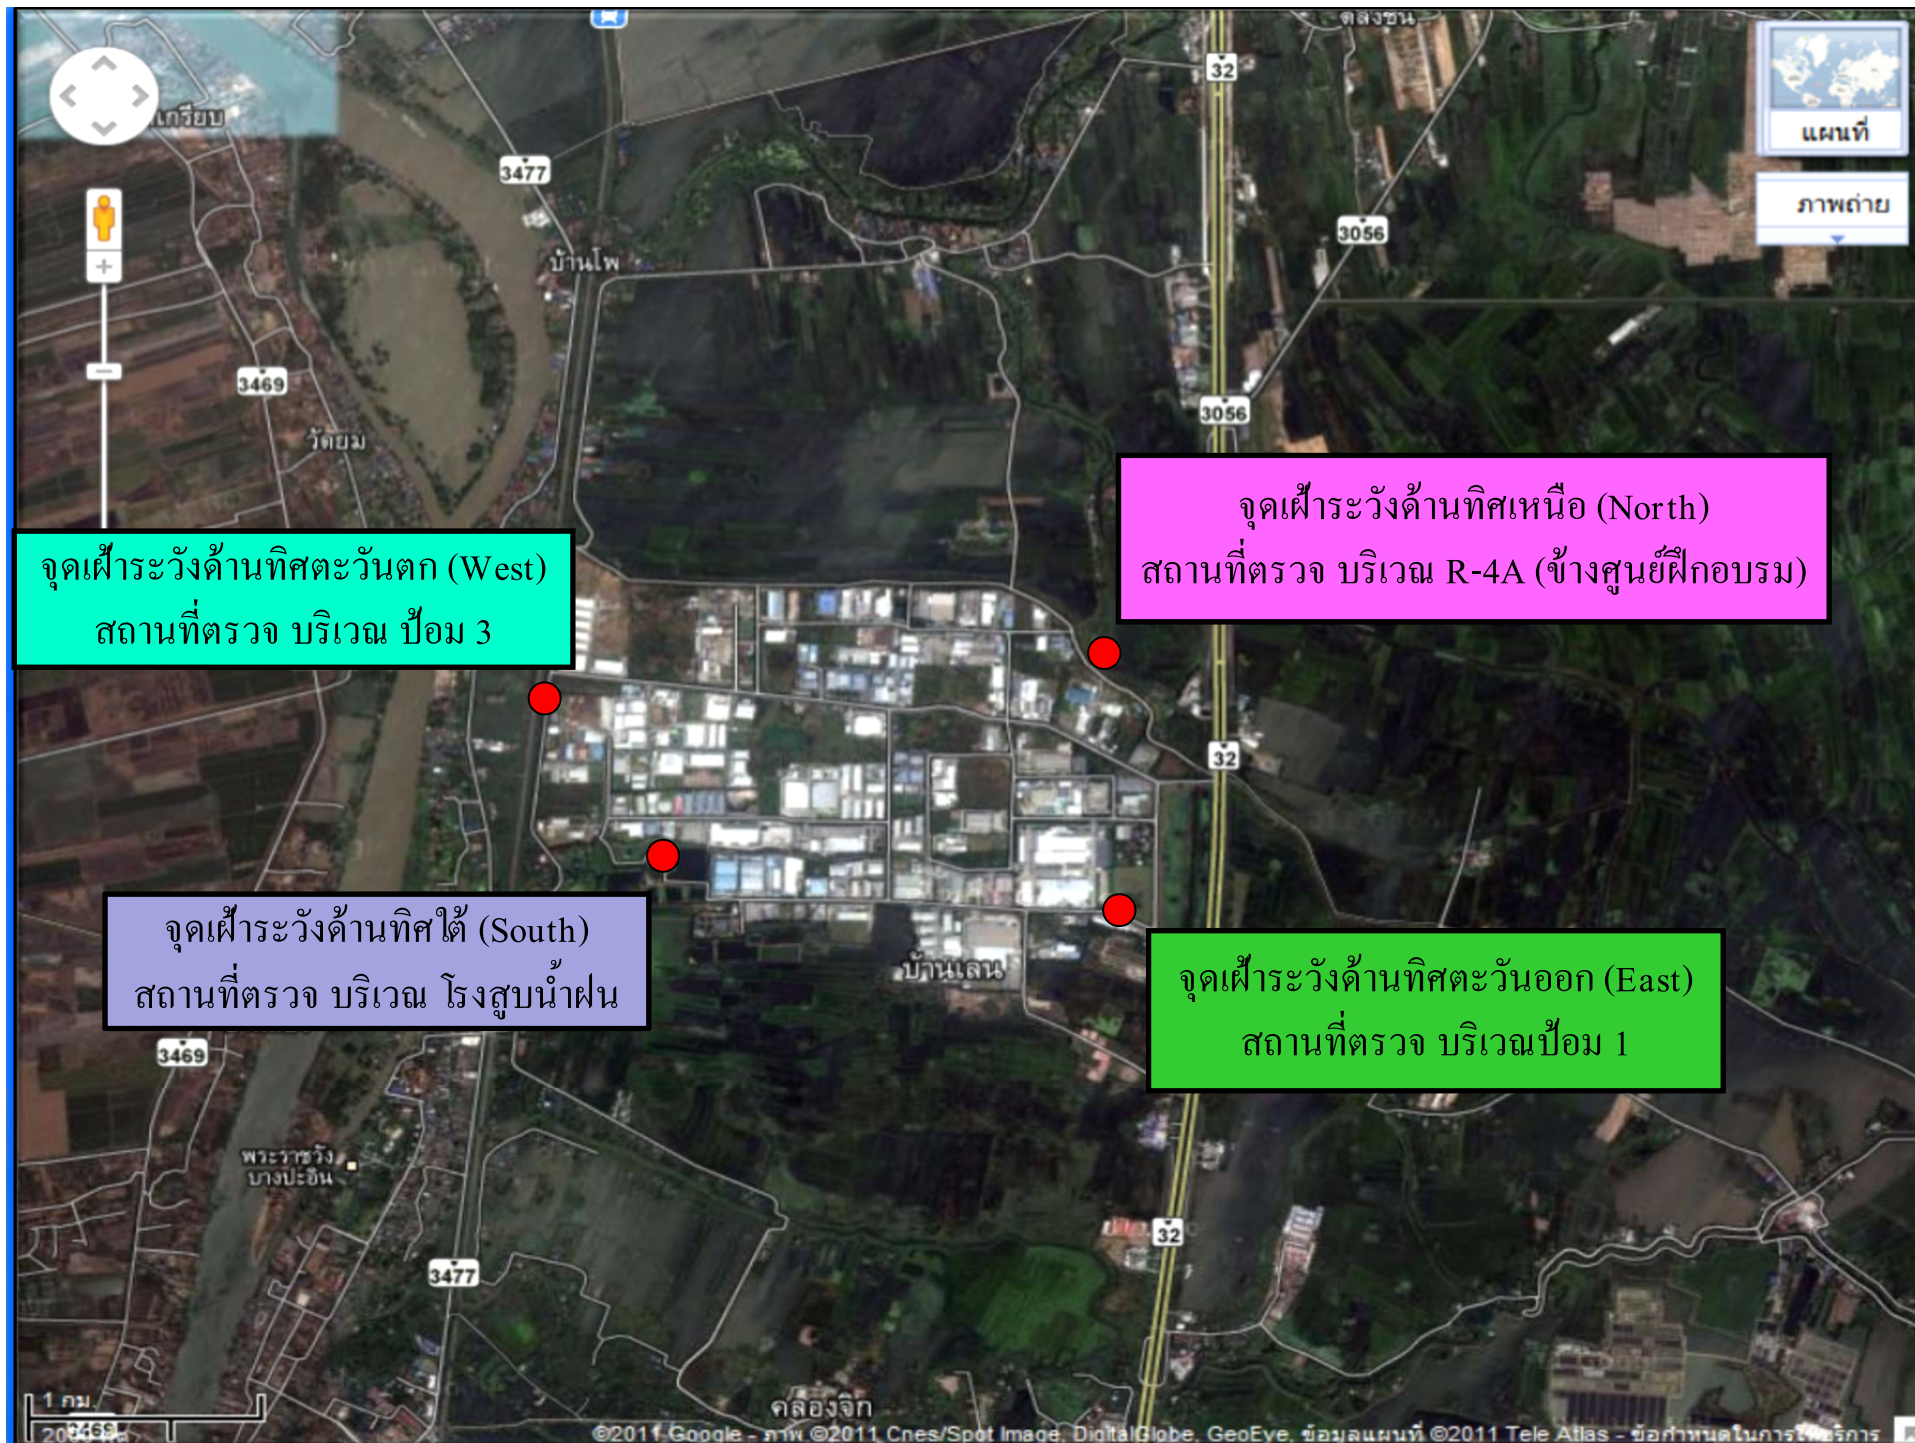

พยากรณ์อากาศระหว่าง 7 วันข้างหน้า
ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 8 พฤศจิกายน 2563

ข้อควรระวัง

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุโซนร้อน “โคนิ” (พายุระดับ 3) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 6 – 7 พ.ย. 2563)" ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) พายุโซนร้อน “โคนิ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 350 กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองกวินอนประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด 14.2 องศาเหนือลองจิจูด 112.3 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองกวินอนประเทศเวียดนามในคืนนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลราชธานีนครนายกและปราจีนบุรี

สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
1 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
2 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
3 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.60 MSL
4 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL
5 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.70 MSL
6 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.63 MSL
7 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
8 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
9 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
10 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.32 MSL
11 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.37 MSL
12 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.05 MSL
13 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.10 MSL
14 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
15 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
16 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
17 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
18 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.45 MSL
19 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
20 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.70 MSL
21 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
22 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.60 MSL
23 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.17 MSL
24 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
25 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
26 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.35 MSL
27 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
28 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.70 MSL
29 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.35 MSL
30 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
31 สิงหาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
1 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
2 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
3 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.70 MSL
4 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
5 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
6 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
7 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
8 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.10 MSL
9 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
10 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
11 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.10 MSL
12 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
13 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
14 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
15 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
16 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
17 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
18 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
19 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
20 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
21 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
22 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.60 MSL
23 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
24 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
25 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
26 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
27 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
28 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
29 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.65 MSL
30 กันยายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.65 MSL
1 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.65 MSL
2 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
3 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.70 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
4 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.60 MSL
5 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL
6 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.70 MSL
7 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.65 MSL
8 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
9 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
10 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.95 MSL
11 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
12 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.85 MSL
13 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL
14 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL
15 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
16 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL
17 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
18 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL
19 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
20 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
21 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
22 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
23 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
24 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
25 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
26 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL
27 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
28 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
29 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.60 MSL
30 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.60 MSL
31 ตุลาคม 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.10 MSL
1 พฤศจิกายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.80 MSL
2 พฤศจิกายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.32 MSL
3 พฤศจิกายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
4 พฤศจิกายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.20 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
5 พฤศจิกายน 2563	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.80 MSL
6 พฤศจิกายน 2563					
7 พฤศจิกายน 2563					
8 พฤศจิกายน 2563					
9 พฤศจิกายน 2563					
10 พฤศจิกายน 2563					
11 พฤศจิกายน 2563					
12 พฤศจิกายน 2563					

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ





ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2562													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.40 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
1 ส.ค. 63	110	16.65	60	14.50	110	0.43	3	113.43	60	2.86	0.30	0.30	5.10
2 ส.ค. 63	111	16.66	60	13.37	111	0.43	5	116.43	60	2.97	0.40	0.10	5.00
3 ส.ค. 63	110	16.65	60	13.35	110	0.43	5	115.43	60	2.98	0.60	0.20	4.80
4 ส.ค. 63	109	16.64	60	13.33	109	0.43	5	114.43	60	2.95	0.90	0.30	4.50
5 ส.ค. 63	119	16.75	60	13.31	119	0.43	5	124.43	60	2.91	0.70	-0.20	4.70
6 ส.ค. 63	145	17.00	60	13.38	145	0.43	5	150.43	60	2.90	0.63	-0.07	4.77
7 ส.ค. 63	251	17.56	60	13.58	251	1.04	5	257.04	60	2.91	0.20	-0.43	5.20
8 ส.ค. 63	289	18.05	60	14.23	289	0.43	5	294.43	60	2.88	0.30	0.10	5.10
9 ส.ค. 63	308	17.65	60	14.71	308	0.43	5	313.43	60	2.81	0.30	0.00	5.10
10 ส.ค. 63	233	17.43	60	14.86	233	1.74	5	239.74	60	2.72	0.32	0.02	5.08
11 ส.ค. 63	162	17.05	60	14.65	162	1.73	5	168.73	60	2.64	0.37	0.05	5.03
12 ส.ค. 63	143	16.85	60	14.31	143	0.43	6	149.43	60	2.55	0.05	-0.32	5.35
13 ส.ค. 63	139	16.81	60	14.02	139	0.43	6	145.43	60	2.45	0.10	0.05	5.30
14 ส.ค. 63	139	16.80	60	13.89	139	0.43	5	144.43	60	2.42	0.20	0.10	5.20
15 ส.ค. 63	136	16.76	60	13.80	136	0.43	6	142.43	60	2.66	0.20	0.00	5.20
16 ส.ค. 63	124	16.6	60	13.71	124	1.30	6	131.30	60	2.84	0.20	0.00	5.20



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2563													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.400 MSL
	จนท.สำรวจ ระดับถึง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
17 ส.ค. 63	136	16.76	60	13.60	136	1.30	6	143.30	60	2.95	0.40	0.20	5.00
18 ส.ค. 63	152	16.96	60	13.56	152	0.44	6	158.44	60	3.01	0.45	0.05	4.95
19 ส.ค. 63	176	17.16	60	13.65	176	0.44	6	182.44	60	3.03	0.40	-0.05	5.00
20 ส.ค. 63	204	17.31	60	13.84	204	0.43	6	210.43	60	3.02	0.70	0.30	4.70
21 ส.ค. 63	216	17.38	60	13.98	216	1.73	6	223.73	60	3.01	0.30	-0.40	0.24
22 ส.ค. 63	202	17.30	60	14.02	202	1.74	6	209.74	60	3.00	0.60	0.30	4.80
23 ส.ค. 63	179	17.4.5	60	13.99	179	0.43	6	185.43	60	2.96	0.17	-0.43	5.23
24 ส.ค. 63	182	17.80	60	13.90	182	1.73	6	189.73	60	2.90	0.30	0.13	5.10
25 ส.ค. 63	251	17.56	60	18.88	251	2.60	3	256.60	60	2.82	0.20	-0.10	5.20
26 ส.ค. 63	521	18.62	60	14.37	521	2.60	3	526.60	60	2.73	0.35	0.15	5.05
27 ส.ค. 63	648	19.07	60	15.06	648	2.60	3	653.60	60	2.62	0.20	-0.15	5.20
28 ส.ค. 63	692	19.21	60	15.62	692	2.61	3	697.61	60	2.66	0.70	0.50	4.70
29 ส.ค. 63	638	19.04	65	15.95	638	2.61	3	643.61	60	2.84	0.35	-0.35	5.05
30 ส.ค. 63	532	18.66	66	15.96	532	2.61	3	537.61	60	2.95	0.30	-0.05	5.10
31 ส.ค. 63	459	18.36	60	15.87	459	1.30	3	463.30	60	2.97	0.50	0.20	4.90
1 ก.ย. 63	391	18.11	60	15.85	391	1.30	3	395.30	60	2.96	0.30	-0.20	5.10



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2563													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25.000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17.000 MSL									
2 ก.ย. 63	331	17.9	60	15.71	331	2.60	3	336.60	60	2.93	0.40	0.10	5.00
3 ก.ย. 63	291	17.74	60	15.58	291	2.60	3	296.60	60	2.91	0.70	0.30	4.70
4 ก.ย. 63	291	17.74	60	15.48	291	1.30	3	295.30	60	2.91	0.50	-0.20	4.90
5 ก.ย. 63	338	17.82	60	15.58	338	1.30	3	342.30	60	2.90	0.40	-0.10	5.00
6 ก.ย. 63	356	17.98	60	15.60	356	1.30	3	360.30	60	2.86	0.40	0.00	5.00
7 ก.ย. 63	382	18.08	60	15.66	382	1.30	3	386.30	60	2.79	0.40	0.00	5.00
8 ก.ย. 63	376	18.06	60	15.70	376	1.30	3	380.30	60	2.73	0.10	-0.30	5.30
9 ก.ย. 63	331	17.90	55	15.68	331	1.30	3	335.30	60	2.67	0.50	0.40	4.90
10 ก.ย. 63	308	17.81	50	15.61	308	1.30	3	312.30	60	2.62	0.20	-0.30	5.20
11 ก.ย. 63	303	17.79	50	15.50	303	1.30	3	307.30	60	2.55	0.10	-0.10	5.30
12 ก.ย. 63	308	17.81	50	15.40	308	1.30	3	312.30	60	2.57	0.20	0.10	5.20
13 ก.ย. 63	308	17.81	50	15.36	308	1.31	3	312.31	60	2.76	0.30	0.10	5.10
14 ก.ย. 63	308	17.81	50	15.34	308	1.31	3	312.31	60	2.90	0.50	0.20	4.90
15 ก.ย. 63	318	17.85	50	15.32	318	1.31	3	322.31	60	2.97	0.50	0.00	4.90
16 ก.ย. 63	298	17.77	50	15.31	298	1.31	3	302.31	60	3.00	0.50	0.00	4.90
17 ก.ย. 63	266	17.63	50	15.23	266	1.31	3	270.31	60	3.01	0.50	0.00	4.90



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2563													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25.000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17.000 MSL									
18 ก.ย. 63	259	17.60	50	15.10	259	1.31	3	263.31	60	3.01	0.30	-0.20	5.10
19 ก.ย. 63	303	17.79	50	15.09	303	0.00	3	306.00	60	3.00	0.50	0.20	4.90
20 ก.ย. 63	407	17.90	50	15.29	407	0.00	3	410.00	60	2.97	0.50	0.00	4.90
21 ก.ย. 63	484	18.47	50	15.66	484	0.00	3	487.00	60	2.94	0.50	0.00	4.90
22 ก.ย. 63	648	19.07	69	16.00	648	0.00	3	651.00	60	2.91	0.60	0.10	4.80
23 ก.ย. 63	679	19.17	96	16.34	679	0.00	3	682.00	60	2.84	0.40	-0.20	5.00
24 ก.ย. 63	626	19.00	113	16.49	262	0.87	3	265.87	60	2.73	0.40	0.00	5.00
25 ก.ย. 63	577	18.83	105	16.42	577	0.87	21	598.87	60	2.65	0.50	0.10	4.90
26 ก.ย. 63	658	18.96	135	16.50	658	0.44	25	683.44	60	2.79	0.30	-0.20	5.10
27 ก.ย. 63	689	18.95	158	16.50	689	0.44	41	730.44	60	2.89	0.30	0.00	5.10
28 ก.ย. 63	692	19.21	193	16.50	692	0.44	31	723.44	100	2.93	0.40	0.10	5.00
29 ก.ย. 63	679	19.17	243	16.50	679	0.00	62	741.00	115	2.94	0.65	0.25	4.75
30 ก.ย. 63	645	19.06	217	16.50	645	0.00	87	732.00	122	2.94	0.60	-0.05	4.80
1 ต.ค. 63	645	19.06	212	16.50	645	0.00	45	690.00	117	2.91	0.65	0.05	4.75
2 ต.ค. 63	803	19.53	278	16.50	803	0.00	21	824.00	164	2.89	0.50	-0.15	4.90
3 ต.ค. 63	929	19.93	489	16.50	929	0.00	21	950.00	179	2.86	0.70	0.20	4.70



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2563													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.400 MSL
	จนท.สำรวจ ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25.000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17.000 MSL									
4 ต.ค. 63	909	19.87	550	16.50	909	0.00	108	1,017.00	184	2.83	0.60	-0.10	4.80
5 ต.ค. 63	886	19.80	561	16.50	886	0.00	103	989.00	148	2.81	0.20	-0.40	5.20
6 ต.ค. 63	877	19.77	545	16.50	877	0.00	104	981.00	176	2.82	0.70	0.50	4.70
7 ต.ค. 63	1,039	20.24	648	16.50	1,039	0.00	100	1,139.00	237	2.80	0.65	0.70	4.75
8 ต.ค. 63	1,135	20.49	726	16.50	1,135	0.00	117	1,252.00	327	2.75	1.00	0.35	4.40
9 ต.ค. 63	1,100	20.40	718	16.50	1,100	0.00	14	1,114.00	416	2.68	0.50	-0.50	4.90
10 ต.ค. 63	1,042	20.28	694	16.50	1,042	0.00	108	1,150.00	384	2.63	0.95	0.45	4.45
11 ต.ค. 63	974	20.06	666	16.50	974	0.00	109	1,083.00	518	2.70	1.00	0.05	4.40
12 ต.ค. 63	919	19.90	660	16.50	919	0.00	105	1,024.00	597	2.82	0.85	-0.15	4.55
13 ต.ค. 63	806	19.54	576	16.50	806	0.44	110	916.44	795	2.90	0.90	0.05	4.50
14 ต.ค. 63	699	19.23	448	16.50	699	0.44	80	779.44	628	2.96	0.90	0.00	4.50
15 ต.ค. 63	588	18.87	336	16.50	588	0.44	31	619.44	522	2.99	1.00	0.10	4.40
16 ต.ค. 63	532	18.66	301	16.50	532	0.00	85	617.00	527	2.99	0.90	-0.10	4.50
17 ต.ค. 63	511	18.85	288	16.50	511	0.00	60	571.00	415	2.98	0.50	-0.40	5.35
18 ต.ค. 63	524	18.63	428	16.50	524	0.00	96	620.00	572	2.99	0.50	0.00	4.90
19 ต.ค. 63	637	18.99	635	16.50	637	0.00	118	755.00	388	3.09	0.90	0.40	4.50



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2563													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
20 ต.ค. 63	746	19.37	889	16.50	746	0.00	80	826.00	429	3.12	1.00	0.10	4.40
21 ต.ค. 63	757	19.40	853	16.50	757	0.00	129	886.00	552	3.08	1.00	0.00	4.40
22 ต.ค. 63	789	19.49	865	16.50	789	0.00	74	863.00	730	3.01	1.00	0.00	4.40
23 ต.ค. 63	732	19.35	813	16.00	732	0.44	74	806.44	750	2.95	1.00	0.00	4.40
24 ต.ค. 63	702	19.18	728	16.50	702	0.44	73	775.44	569	2.91	1.10	0.10	4.30
25 ต.ค. 63	638	19.04	601	16.50	638	0.00	70	708.00	708	2.88	1.10	0.00	4.30
26 ต.ค. 63	583	18.85	504	16.50	583	0.44	10	593.44	676	2.87	0.90	-0.20	4.50
27 ต.ค. 63	526	18.63	338	16.50	526	0.44	ปิด	526.44	558	2.86	0.90	0.00	4.50
28 ต.ค. 63	456	18.35	210	16.50	456	0.43	ปิด	456.43	542	2.86	1.10	0.20	4.30
29 ต.ค. 63	404	18.15	120	16.50	404	0.44	ปิด	404.44	482	2.85	0.60	-0.50	4.80
30 ต.ค. 63	379	18.07	106	16.43	379	0.27	ปิด	379.27	448	2.83	0.60	0.00	4.80
31 ต.ค. 63	403	18.20	106	16.41	403	0.27	78	403.27	243	2.80	1.10	0.50	4.30
1 พ.ย. 63	408	18.23	113	16.49	408	0.00	102	408.00	285	2.92	0.80	-0.30	4.60
2 พ.ย. 63	403	18.20	130	16.50	403	0.00	186	403.00	418	3.00	0.32	-0.48	5.08
3 พ.ย. 63	420	18.29	188	16.50	420	0.00	127	420.00	400	3.04	1.00	0.68	4.40
4 พ.ย. 63	461	18.49	228	16.50	461	0.00	117	461.00	498	3.05	0.20	-0.80	5.20



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำย้อนหลังในปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณสูงสุด



ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง			
ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำที่ระบายทั้ง 3 เขื่อนสูงสุด (ลบ.ม./วินาที)	มีมวลน้ำที่ไหลผ่านนิคมฯบ้านห้วย (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงสุด Intake (MSL)
2553	5,718 (24 ต.ค.53)	3,526 (29 ต.ค.53)	4.01 (31 ต.ค.56)
2554	5,893 (6,8 ต.ค.54)	3,860 (15 ต. ค.54)	4.90 (15 ต. ค.54)
2555	1,643 (5 ต.ค.55)	1,764 (5 ต.ค.55)	2.00 (5 ต.ค.55)
2556	1,480 (31 ต.ค.56)	1,502 (31 ต.ค.56)	2.30 (31 ต.ค.56)
2557	255.89 (17 ต.ค.57)	645 (17 ต.ค.57)	0.00 (17 ต.ค.57)
2558	-	-	-
2559	3,083.54 (11 ต.ค.59)	2,172 (11 ต.ค.59)	1.39 (11 ต.ค.59)
2560	3,584.29 (22 ต.ค.60)	2,696 (22 ต.ค.60)	2.95 (22 ต.ค.60)
2561	1,614.34 (18 ก.ย.61)	841 (11 ก.ย. 61)	1.42 (11 ก.ย.61)
2562	1,545.75 (9 ก.ย.62)	889 (8 ก.ย.62)	1.39 (29 ก.ย.62)
2563	571.00 (5 พ.ย.63)	437 (5 พ.ย.63)	0.80 (5 พ.ย.63)
