

รายงานสถานการณ์

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ปี 2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564





เกณฑ์กำหนดการเตือนภัย (อุทกภัย)

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)


เกณฑ์กำหนดการเตือนภัย (อุทกภัย) นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

สัญลักษณ์เตือนภัย	เกณฑ์/ระดับน้ำนอกคัน	จุดเฝ้าระวัง	ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่รับผิดชอบ
(สีเขียว)	1 (ปกติ) น้อยกว่า 3.500 MSL.	1. ทิศเหนือ จุดวัดระดับน้ำด้านหลังศูนย์เทคโนโลยี 2. ทิศใต้ จุดวัดระดับน้ำด้านหลังสถานีสูบน้ำฝนนิคมฯ 3. ทิศตะวันออก จุดวัดระดับน้ำทางเข้าออกนิคมฯ ประตู่ 1 4. ทิศตะวันตก จุดวัดระดับน้ำทางเข้าออกนิคมฯ ประตู่ 3	1.ผอ.ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2.ทีมสื่อสารและประสานงาน 3.ทีมระงับเหตุ	1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ 3. จัดเตรียมสำรวจความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์
(สีเหลือง)	2 (เฝ้าระวัง) ตั้งแต่ +3.500 ถึง +4.500 MSL.	ทั้งนี้ ให้เฝ้าระวังติดตาม การผันน้ำจากภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ดังนี้ - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2 (อ.เมือง จ.นครสวรรค์) ใช้ระดับน้ำไม่เกิน +25.000 MSL. และปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท) ใช้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่เกิน +17.000 MSL. และปริมาณการระบายน้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.29 (อ.บางไทร จ.อยุธยา) ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	1.ผอ.ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน	1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ 3. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ. 4. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ 5. จัดตั้งศูนย์ ศอ.อ. นิคมฯ
(สีส้ม)	3 (เสี่ยง) ตั้งแต่ +4.500 ถึง +5.100 MSL.	- สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท) ใช้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่เกิน +17.000 MSL. และปริมาณการระบายน้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที - สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.29 (อ.บางไทร จ.อยุธยา) ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	1.ผอ.ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน 6.ทีม Utility 7.ทีมสนับสนุน	1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ 2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ 3. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ. 4. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ แจ้งชนย้ายทรัพย์สิน สารเคมีเก็บในที่ปลอดภัย 5. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและพิทักษ์ทรัพย์สิน 6. จัดหาสถานที่/เส้นทางอพยพ 7. เก็บของขึ้นที่สูง
(สีแดง)	4 (วิกฤต) ตั้งแต่ +5.100 MSL. ขึ้นไป หรือ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอื่นๆ	หากเกินเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ น้ำจะเริ่มท่วมจาก อ่างทอง สิงห์บุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหรือคันป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ จะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าได้	1.ผอ.ควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2.ทีมประชาสัมพันธ์ 3.ทีมสื่อสารและประสานงาน 4.ทีมระงับเหตุ 5.ทีมผู้ประสานงาน 6.ทีม Utility 7.ทีมสนับสนุน	1. ประกาศอพยพ 2. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ แจ้งผู้ประกอบการให้หยุดประกอบกิจการและแจ้งผู้นำชุมชนในศูนย์พักพิงอพยพออกนอกนิคมฯ 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและพิทักษ์ทรัพย์สิน 4. จัดหาสถานที่/อาหาร/เวชภัณฑ์ 5. จัดเตรียมศูนย์พยาบาลชั่วคราว

พยากรณ์อากาศระหว่าง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน– 7 พฤศจิกายน 2564

ข้อควรระวัง

บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

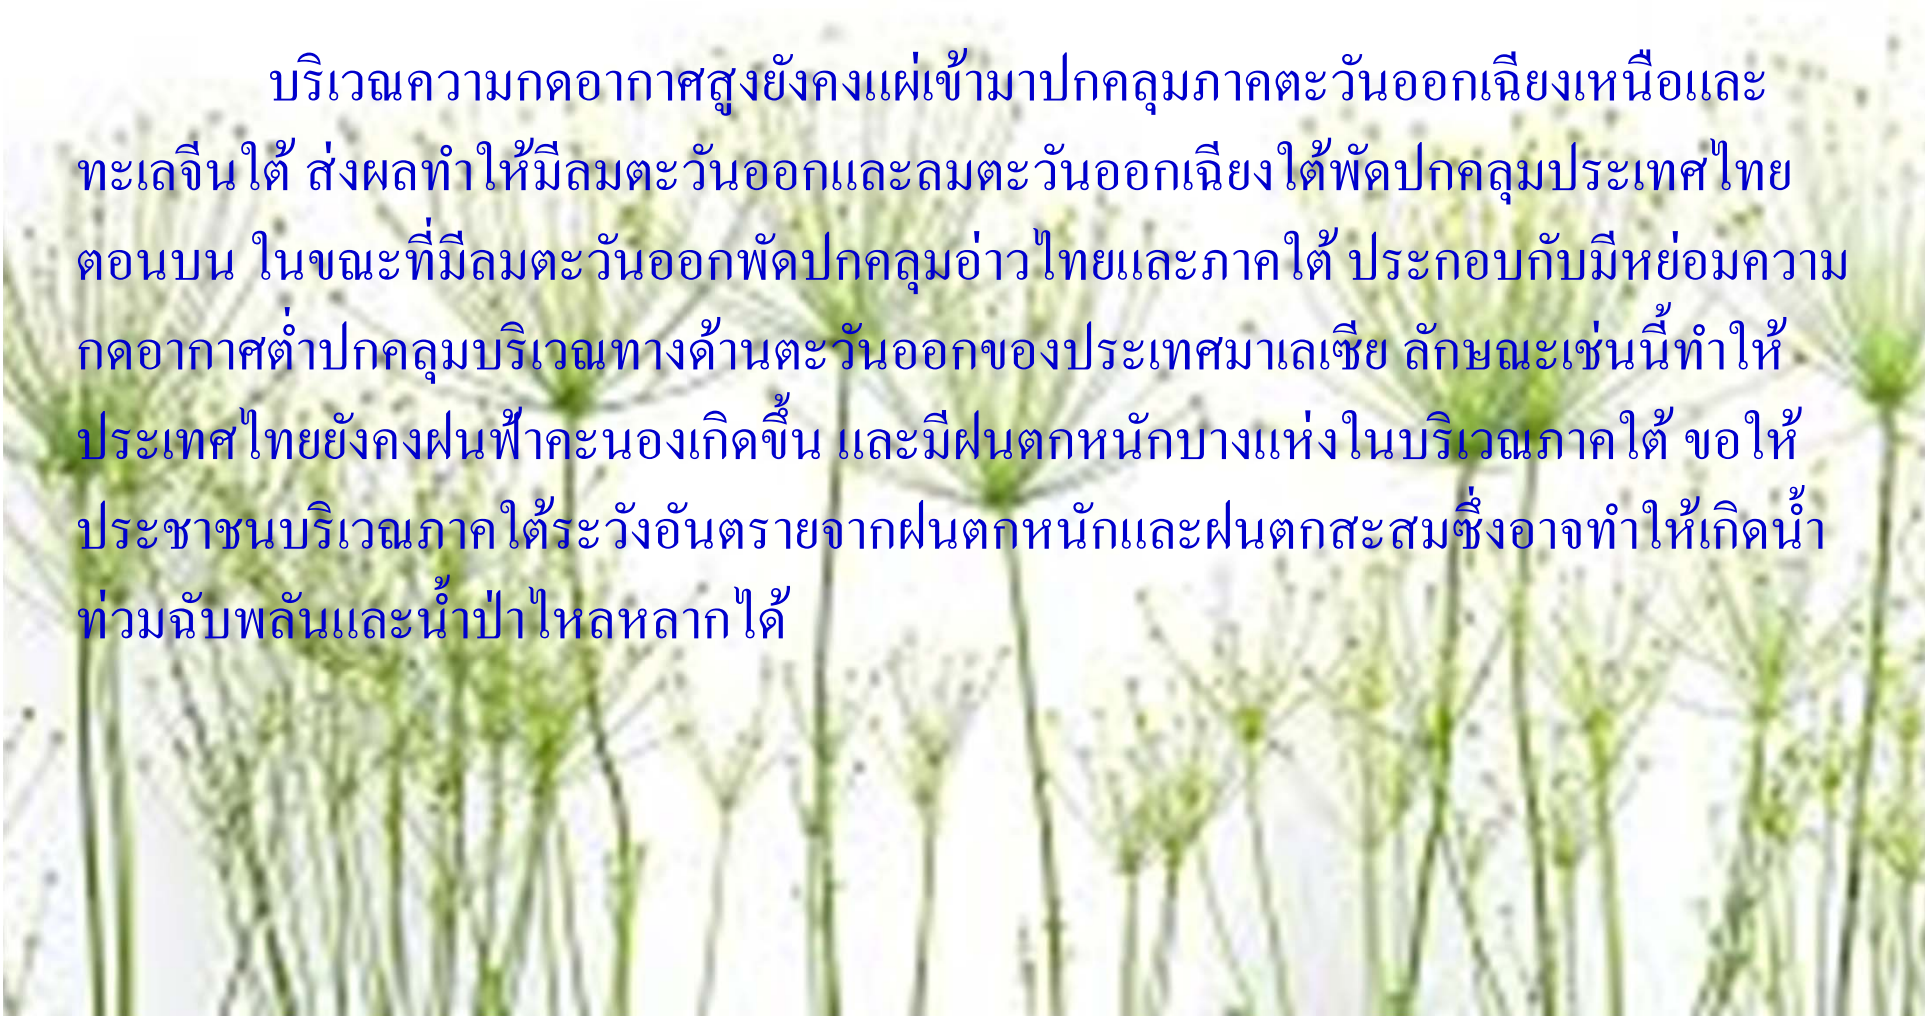

สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
2 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.14 MSL
3 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
4 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.39 MSL
5 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.21 MSL
6 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.32 MSL
7 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.49 MSL
8 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
9 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.54 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
10 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.58 MSL
11 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
12 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.47 MSL
13 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.34 MSL
14 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.18 MSL
15 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.41 MSL
16 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
17 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.22 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
18 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.34 MSL
19 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
20 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.58 MSL
21 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.67 MSL
22 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.70 MSL
23 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.65 MSL
24 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
25 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.50 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
26 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.22 MSL
27 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
28 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.45 MSL
29 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.40 MSL
30 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.34 MSL
31 สิงหาคม 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.45 MSL
1 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
2 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.45 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
3 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.44 MSL
4 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.30 MSL
5 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.99 MSL
6 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL
7 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.95 MSL
8 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.06 MSL
9 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.98 MSL
10 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.90 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
11 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.89 MSL
12 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+0.98 MSL
13 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
14 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
15 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.20 MSL
16 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.38 MSL
17 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.00 MSL
18 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.42 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
19 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.39 MSL
20 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.50 MSL
21 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.20 MSL
22 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.74 MSL
23 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.74 MSL
24 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.74 MSL
25 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+1.85 MSL
26 กันยายน 2564	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.00 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	08.00-12.00 13.00-17.00	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
27 กันยายน 2564		+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.18 MSL
28 กันยายน 2564		+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.15 MSL
29 กันยายน 2564	เช้า	+2.50 MSL	+2.54 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.54 MSL
	บ่าย	+2.50 MSL	+2.60 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.60 MSL
30 กันยายน 2564	เช้า	+2.50 MSL	+2.70 MSL	+2.50 MSL	+2.89 MSL	+2.82 MSL
	บ่าย	+2.50 MSL	+2.54 MSL	+2.50 MSL	+2.69 MSL	+2.85 MSL
1 ตุลาคม 2564	เช้า	+2.55 MSL	+2.41 MSL	+2.50 MSL	+2.60 MSL	+3.05 MSL
	บ่าย	+2.55 MSL	+2.51 MSL	+2.50 MSL	+2.63 MSL	+3.01 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์ โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	08.00-12.00 13.00-17.00	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
2 ตุลาคม 2564	เช้า	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.70 MSL	+3.20 MSL
	บ่าย	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.70 MSL	+3.14 MSL
3 ตุลาคม 2564	เช้า	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.78 MSL	+ 3.40 MSL
	บ่าย	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.74 MSL	+3.50 MSL
4 ตุลาคม 2564	เช้า	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+ 2.80 MSL	+3.80 MSL
	บ่าย	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+ 2.79 MSL	+3.30 MSL
5 ตุลาคม 2564	เช้า	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+ 2.80 MSL	+3.45 MSL
	บ่าย	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+ 2.80 MSL	+3.38 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์ โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	08.00-12.00 13.00-17.00	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
6 ตุลาคม 2564	เช้า	+2.50 MSL	+2.52 MSL	+2.50 MSL	+2.81 MSL	+3.40 MSL
	บ่าย	+2.50 MSL	+2.52 MSL	+2.50 MSL	+2.81 MSL	+3.40 MSL
7 ตุลาคม 2564	เช้า	+2.53 MSL	+2.53 MSL	+2.50 MSL	+2.82 MSL	+3.35 MSL
	บ่าย	+2.53 MSL	+2.53 MSL	+2.50 MSL	+2.82 MSL	+3.35 MSL
8 ตุลาคม 2564	เช้า	+2.56 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.85 MSL	+3.49 MSL
	บ่าย	+2.56 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.85 MSL	+3.49 MSL
9 ตุลาคม 2564	-	+2.56 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.86 MSL	+3.43 MSL
10 ตุลาคม 2564	-	+2.57 MSL	+2.50 MSL	+2.50 MSL	+2.88 MSL	+3.40 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์ โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
11 ตุลาคม 2564	+2.60 MSL	+2.57 MSL	+2.50 MSL	+2.89 MSL	+3.47 MSL
12 ตุลาคม 2564	+2.62 MSL	+2.57 MSL	+2.50 MSL	+2.90 MSL	+3.43 MSL
13 ตุลาคม 2564	+2.63 MSL	+2.58 MSL	+2.50 MSL	+2.89 MSL	+3.37 MSL
14 ตุลาคม 2564	+2.66 MSL	+2.55 MSL	+2.50 MSL	+2.80 MSL	+3.15 MSL
15 ตุลาคม 2564	+2.67 MSL	+2.55 MSL	+2.50 MSL	+2.80 MSL	+3.18 MSL
16 ตุลาคม 2564	+2.72 MSL	+2.58 MSL	+2.98 MSL	+2.80 MSL	+3.21 MSL
17 ตุลาคม 2564	+2.77 MSL	+2.60 MSL	+3.05 MSL	+2.87 MSL	+3.30 MSL
18 ตุลาคม 2564	+2.77 MSL	+2.63 MSL	+3.10 MSL	+2.88 MSL	+3.35 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
19 ตุลาคม 2564	+2.78 MSL	+2.60 MSL	+3.10 MSL	+2.89 MSL	+3.42 MSL
20 ตุลาคม 2564	+2.79 MSL	+2.65 MSL	+3.15 MSL	+2.92 MSL	+3.45 MSL
21 ตุลาคม 2564	+2.82 MSL	+2.65 MSL	+3.13 MSL	+2.94 MSL	+3.50 MSL
22 ตุลาคม 2564	+2.83 MSL	+2.70 MSL	+3.14 MSL	+3.00 MSL	+3.53 MSL
23 ตุลาคม 2564	+2.88 MSL	+2.70 MSL	+3.18 MSL	+3.10 MSL	+3.55 MSL
24 ตุลาคม 2564	+2.88 MSL	+2.70 MSL	+3.19 MSL	+3.10 MSL	+3.57 MSL
25 ตุลาคม 2564	+2.88 MSL	+2.73 MSL	+3.19 MSL	+3.08 MSL	+3.54 MSL
26 ตุลาคม 2564	+2.89 MSL	+2.73 MSL	+3.20 MSL	+3.08 MSL	+3.54 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ



สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

วัน/เดือน/ปี	ทิศเหนือ (North)	ทิศใต้ (South)	ทิศตะวันออก (East)	ทิศตะวันตก (West)	แม่น้ำเจ้าพระยา (Intake)
27 ตุลาคม 2564	+2.89 MSL	+2.73 MSL	+3.21 MSL	+3.08 MSL	+3.54 MSL
28 ตุลาคม 2564	+2.89 MSL	+2.73 MSL	+3.21 MSL	+3.08 MSL	+3.45 MSL
29 ตุลาคม 2564	+2.91 MSL	+2.73 MSL	+3.22 MSL	+3.04 MSL	+3.40 MSL
30 ตุลาคม 2564	+2.91 MSL	+2.73 MSL	+3.22 MSL	+3.00 MSL	+3.35 MSL
31 ตุลาคม 2564	+2.93 MSL	+2.73 MSL	+3.25 MSL	+3.00 MSL	+3.31 MSL
1 พฤศจิกายน 2564	+2.93 MSL	+2.73 MSL	+3.25 MSL	+2.80 MSL	+3.25 MSL
2 พฤศจิกายน 2564	+2.95 MSL	+2.73 MSL	+3.26 MSL	+2.60 MSL	+3.23 MSL
3 พฤศจิกายน 2564	+2.97 MSL	+2.78 MSL	+3.28 MSL	+2.80 MSL	+3.25 MSL

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ





ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2564

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.40 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับคลัง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
2 ส.ค. 64	98	16.64	50	13.33	98	0.43	1	99.43	56	2.52	0.39	0.39	5.01
3 ส.ค. 64	110	16.75	50	13.31	110	0.58	1	111.58	60	2.39	0.21	-0.18	5.19
4 ส.ค. 64	121	16.64	60	13.33	121	0.86	1	122.86	75	2.53	0.39	0.18	4.50
5 ส.ค. 64	135	16.75	60	13.31	135	0.93	1	136.93	83	2.75	0.21	-0.18	5.19
6 ส.ค. 64	154	16.65	75	13.85	154	1.30	1	156.30	103	2.89	0.32	0.11	5.08
7 ส.ค. 64	150	16.85	75	13.70	150	1.30	1	152.30	96	2.97	0.49	0.17	4.91
8 ส.ค. 64	142	16.76	70	13.59	142	1.30	1	144.30	92	3.01	0.30	-0.19	5.10
9 ส.ค. 64	147	16.81	70	13.47	147	1.30	1	149.30	88	3.01	0.54	0.24	4.86
10 ส.ค. 64	157	16.92	70	13.39	157	1.30	1	159.30	85	2.99	0.58	0.04	4.82
11 ส.ค. 64	166	17.02	70	13.41	166	1.30	1	168.30	81	2.94	0.30	-0.28	5.10
12 ส.ค. 64	167	13.70	70	13.49	167	1.30	1	169.30	78	2.89	0.47	0.17	4.93
13 ส.ค. 64	161	16.97	70	13.60	161	1.30	1	163.30	76	2.85	0.34	-0.13	5.06
14 ส.ค. 64	152	16.82	70	13.66	152	2.16	1	155.16	74	2.81	0.18	-0.16	5.22
15 ส.ค. 64	143	16.77	60	13.59	143	2.16	1	146.16	73	2.79	0.41	0.23	4.99
16 ส.ค. 64	148	16.82	60	13.52	148	2.16	1	151.16	70	2.74	0.30	-0.11	5.10
17 ส.ค. 64	161	16.97	60	13.51	161	2.16	1	164.16	69	2.65	0.22	-0.08	5.18



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2564

ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไยเทค) ประจำปี 2564													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับคลัง +2.6200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
18 ส.ค. 64	182	17.18	60	13.58	182	1.73	1	184.73	66	2.62	0.34	0.12	5.06
19 ส.ค. 64	225	17.46	70	13.77	225	1.73	1	227.73	64	2.86	0.30	-0.04	5.10
20 ส.ค. 64	221	17.44	60	14.02	221	1.73	1	223.73	62	3.03	0.58	0.28	4.82
21 ส.ค. 64	197	17.31	60	14.02	197	1.73	1	199.73	61	3.09	0.67	0.09	4.73
22 ส.ค. 64	206	17.36	60	14.11	206	0.7	1	207.70	60	3.09	0.70	0.03	4.70
23 ส.ค. 64	215	17.41	60	14.14	215	0.70	1	216.70	61	3.04	0.65	-0.05	4.75
24 ส.ค. 64	208	17.52	60	14.19	208	0.43	1	209.43	60	2.99	0.30	-0.35	5.10
25 ส.ค. 64	196	17.30	60	14.20	196	0.43	1	197.43	59	2.96	0.50	0.20	4.90
26 ส.ค. 64	191	17.26	60	14.22	191	0.43	1	192.43	59	2.92	0.22	-0.28	5.18
27 ส.ค. 64	181	17.17	60	14.24	181	0.43	1	182.43	60	2.88	0.30	0.08	5.10
28 ส.ค. 64	167	17.35	50	14.24	167	0.43	1	168.43	60	2.83	0.45	0.15	4.95
29 ส.ค. 64	180	17.16	50	14.20	180	0.43	1	181.43	60	2.77	0.40	-0.05	5.00
30 ส.ค. 64	241	17.54	50	14.36	241	0.44	1	242.44	59	2.69	0.34	-0.06	5.06
31 ส.ค. 64	426	18.20	50	14.71	426	0.26	1	427.26	59	2.57	0.45	0.11	4.95
1 ก.ย. 64	712	19.20	60	15.72	712	0.26	1	713.26	60	2.50	0.30	-0.15	5.10
2 ก.ย. 64	723	19.23	110	16.29	723	0.27	1	724.27	72	2.67	0.45	0.15	4.95



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านหว้า(ไฮเทค) ประจำปี 2564													
วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านหว้า ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านหว้า (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านหว้า +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับตลิ่ง +2.6200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
3 ก.ย. 64	716	19.21	205	16.50	716	0.26	1	717.26	74	2.85	0.44	-0.01	4.96
4 ก.ย. 64	763	19.36	494	16.50	763	0.26	59	822.26	86	2.96	0.30	-0.14	5.10
5 ก.ย. 64	841	19.61	563	16.50	841	0.27	110	951.27	129	3.01	0.99	0.69	4.41
6 ก.ย. 64	936	19.89	633	16.50	936	0.26	118	1,054.26	194	3.01	0.90	-0.09	4.50
7 ก.ย. 64	983	20.02	700	16.50	983	0.26	54	1,037.26	291	2.98	0.95	0.05	4.45
8 ก.ย. 64	932	19.88	751	16.42	932	0.26	138	1,070.26	452	2.94	1.06	0.11	4.34
9 ก.ย. 64	841	19.61	751	16.11	841	0.00	65	906.00	632	2.90	0.98	-0.08	4.42
10 ก.ย. 64	828	19.57	626	16.00	828	0.00	67	895.00	681	2.87	0.90	-0.08	4.50
11 ก.ย. 64	831	20.10	611	16.00	831	0.00	142	973.00	718	2.87	0.89	-0.01	4.51
12 ก.ย. 64	1,158	20.60	850	15.59	1,158	0.00	138	1,296.00	727	2.88	0.98	0.09	4.42
13 ก.ย. 64	1,827	22.10	1,199	15.90	1,827	0.00	120	1,947.00	688	2.86	1.00	0.02	4.40
14 ก.ย. 64	1,909	22.34	1,321	16.50	1,909	0.00	83	1,992.00	752	2.78	1.00	0.00	4.40
15 ก.ย. 64	1,864	22.21	1,423	16.50	1,864	0.00	126	1,990.00	863	2.68	1.20	0.20	4.20
16 ก.ย. 64	1,754	21.95	1,338	16.50	1,754	0.00	115	1,869.00	1,125	2.83	1.38	0.18	4.02
17 ก.ย. 64	1,627	21.70	1,287	16.50	1,627	0.00	44	1,671.00	1,285	2.98	1.00	-0.38	4.40
18 ก.ย. 64	1,642	21.86	1,285	16.50	1,642	0.00	101	1,743.00	1,324	3.05	1.42	0.42	3.98



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2564

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับตึง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
19 ก.ย. 64	1,808	22.06	1,350	16.38	1,808	0.00	38	1,846.00	1,425	3.06	1.39	-0.03	4.01
20 ก.ย. 64	1,912	22.32	1,400	16.45	1,912	0.00	96	2,008.00	1,480	3.04	1.50	0.11	3.90
21 ก.ย. 64	1,962	22.51	1,481	16.50	1,962	0.00	80	2,042.00	1,547	2.99	1.20	-0.30	4.20
22 ก.ย. 64	1,937	22.43	1,610	16.50	1,937	0.00	43	1,980.00	1,654	2.94	1.74	0.54	3.66
23 ก.ย. 64	1,962	22.51	1,749	16.50	1,962	0.00	166	2,128.00	1,637	2.90	1.74	0.00	3.66
24 ก.ย. 64	2,122	23.01	1,951	16.29	2,122	0.00	144	2,266.00	1,764	2.88	1.74	0.00	3.66
25 ก.ย. 64	2,172	23.14	2,072	16.50	2,172	0.00	211	2,383.00	1,786	2.87	1.85	0.11	3.55
26 ก.ย. 64	2,332	23.56	2,349	16.42	2,332	0.00	329	2,661.00	1,850	2.84	2.00	0.15	3.40
27 ก.ย. 64	2,419	23.78	2,500	16.61	2,419	8.64	379	2,806.64	2,127	2.77	2.18	0.18	3.22
28 ก.ย. 64	2,521	24.03	2,631	17.00	2,521	34.63	390	2,945.63	2,311	2.68	2.15	-0.03	3.25
29 ก.ย. 64	2,683	24.41	2,749	17.00	2,683	51.89	461	3,195.89	2,561	2.58	2.54	0.39	2.86
30 ก.ย. 64	2,683	24.41	2,775	17.00	2,683	103.72	735	3,521.72	2,873	2.59	2.82	0.28	2.58
1 ต.ค. 64	2,666	24.37	2,784	17.06	2,666	104.28	740	3,510.28	2,950	2.75	3.05	0.23	2.35
2 ต.ค. 64	2,657	23.35	2,766	17.08	2,657	99.41	762	3,518.41	3,010	2.89	3.20	0.15	2.20
3 ต.ค. 64	2,631	24.29	2,784	17.11	2,631	98.81	762	3,491.81	3,052	2.95	3.40	0.20	2.00
4 ต.ค. 64	2,661	24.3	2,771	17.12	2,661	97.91	762	3,520.91	3,091	2.96	3.80	0.40	1.60



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ในแต่ละวัน



ข้อมูลระบายน้ำของเขื่อนต่าง ๆ และระดับน้ำด้านนอกเทียบกับคันคลอง/เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯบ้านห้วย(ไฮเทค) ประจำปี 2564

วัน เดือน ปี	สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2		สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13		ปริมาณน้ำผ่านเขื่อน			รวมปริมาณ น้ำที่เขื่อน ระบายทั้ง 3 เขื่อน ลบ.ม/วินาที	มีปริมาณ มวลน้ำไหล ผ่านนิคมฯ บ้านห้วย ลบ.ม/วินาที C.29A	ระดับน้ำ ทะเลหนุน สูงสุด (เมตร)	ระดับน้ำของแม่น้ำ เจ้าพระยาหน้า เขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมของนิคมฯ บ้านห้วย (+MSL) Intake	ระดับน้ำ ขึ้น-ลงเทียบ จากเมื่อวาน (เมตร)	คงเหลือระยะห่างจาก ระดับน้ำด้านนอกถึง หลังเขื่อนป้องกันน้ำ ท่วมนิคมฯบ้านห้วย +5.400 MSL
	จนครสวรรค์ ระดับตึง +2.6.200 MSL		เขื่อนเจ้าพระยา		เขื่อน เจ้าพระยา ลบ.ม/วินาที C.2	เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ ลบ.ม/วินาที	เขื่อน พระรามหก ลบ.ม/วินาที						
	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกินที่ +25,000 MSL	ปริมาณน้ำต้อง ไม่เกิน 3.000 ลบ.ม/วินาที	ระดับน้ำเหนือ เขื่อนต้องไม่เกิน +17,000 MSL									
5 ต.ค. 64	2,614	24.25	2,788	17.16	2,614	86.43	763	3,463.43	3,088	2.93	3.45	-0.35	1.95
6 ต.ค. 64	2,572	24.15	2,749	17.09	2,572	77.82	762	3,411.82	3,104	2.90	3.40	-0.05	2.00
7 ต.ค. 64	2,542	24.08	2,698	17.03	2,542	96.13	791	3,429.13	3,096	2.66	3.35	-0.05	2.05
8 ต.ค. 64	2,505	23.99	2,602	17.10	2,505	64.85	790	3,359.85	3,014	2.88	3.49	0.14	1.91
9 ต.ค. 64	2,501	23.98	2,577	17.10	2,501	56.16	790	3,347.16	2,910	2.97	3.43	-0.06	1.97
10 ต.ค. 64	2,451	23.86	2,545	17.15	2,451	47.56	750	3,248.56	2,960	3.02	3.40	-0.03	2.00
11 ต.ค. 64	2,371	23.71	2,520	17.11	2,371	38.95	676	3,085.95	2,963	3.01	3.47	0.07	1.93
12 ต.ค. 64	2,308	23.59	2,428	17.15	2,308	17.36	657	2,982.36	2,817	2.94	3.43	-0.04	1.97
13 ต.ค. 64	2,288	23.55	2,345	17.15	2,288	4.38	305	2,597.38	2,820	2.90	3.37	-0.06	2.03
14 ต.ค. 64	2,334	23.64	2,291	17.10	2,334	25.99	149	2,508.99	2,742	2.92	3.15	-0.22	2.25
15 ต.ค. 64	2,371	23.71	2,380	17.10	2,371	25.96	192	2,588.96	2,560	2.97	3.18	0.03	2.22
16 ต.ค. 64	2,504	23.67	2,350	17.10	2,504	34.60	335	2,873.60	2,646	3.00	3.21	0.03	2.19
17 ต.ค. 64	2,366	23.70	2,545	17.10	2,366	38.95	380	2,784.95	2,724	3.01	3.30	0.09	2.10
18 ต.ค. 64	2,484	23.94	2,545	17.15	2,484	47.60	647	3,178.60	2,827	2.98	3.35	0.05	2.05
19 ต.ค. 64	2,704	24.46	2,673	17.15	2,704	51.90	690	3,445.90	2,923	2.94	3.42	0.07	1.98
20 ต.ค. 64	2,691	24.43	2,766	17.29	2,691	51.91	693	3,435.91	3,051	2.88	3.45	0.03	1.95



ข้อมูลแสดงการระบายน้ำย้อนหลังในปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณสูงสุด



ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง			
ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำที่ระบายทั้ง 3 เขื่อนสูงสุด (ลบ.ม./วินาที)	มีมวลน้ำที่ไหลผ่านนิคมฯบ้านห้วย (ลบ.ม./วินาที)	ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงสุด Intake (MSL)
2553	5,718 (24 ต.ค.53)	3,526 (29 ต.ค.53)	4.01 (31 ต.ค.56)
2554	5,893 (6,8 ต.ค.54)	3,860 (15 ต. ค.54)	4.90 (15 ต. ค.54)
2555	1,643 (5 ต.ค.55)	1,764 (5 ต.ค.55)	2.00 (5 ต.ค.55)
2556	1,480 (31 ต.ค.56)	1,502 (31 ต.ค.56)	2.30 (31 ต.ค.56)
2557	255.89 (17 ต.ค.57)	645 (17 ต.ค.57)	0.00 (17 ต.ค.57)
2558	-	-	-
2559	3,083.54 (11 ต.ค.59)	2,172 (11 ต.ค.59)	1.39 (11 ต.ค.59)
2560	3,584.29 (22 ต.ค.60)	2,696 (22 ต.ค.60)	2.95 (22 ต.ค.60)
2561	1,614.34 (18 ก.ย.61)	841 (11 ก.ย. 61)	1.42 (11 ก.ย.61)
2562	1,545.75 (9 ก.ย.62)	889 (8 ก.ย.62)	1.39 (29 ก.ย.62)
2563	1252.00 (8 ต.ค.63)	795 (13 ต.ค.63)	1.10 (24 ต.ค.63)
2564	2,739.32 ลบ.ม./วินาที (3 พ.ย.64)	2,609 ลบ.ม/วินาที (3 พ.ย.64)	3.25 MSL (3 พ.ย.64)
